



PRO-WPL2

TEAM 05

Logboek – Opzetten van een website “For rent”

A screenshot of the website for Depo DenOpschlagh. The header features the logo "Depo DenOpschlagh" with a small icon of a building. The top navigation bar includes links for "Homepage", "Huren", "Keuzehulp", "Over ons", and "Contact". Below the header, there is a large image of a modern building with several dark grey garage doors. To the left of the image, there is a welcome message and a "Ontdek" button.

Inhoud

Het Team	4
Project introductie	5
Identiteit.....	5
Voorstelling.....	5
Product Backlog - volledig project	6
Plan van aanpak.....	8
Sprint 1	9
Backlog	9
Takverdeling & planning.....	10
Scrum Bord	12
Timesheets	13
Daily scrums.....	17
Realisaties (Sprint Review)	21
Leerpunten (Sprint Retrospective).....	23
Feedback	25
Sprint 2	27
Backlog	27
Takverdeling & planning.....	29
Scrum Bord	31
Timesheets	33
Daily scrums.....	38
Realisaties (Sprint Review)	40
Leerpunten (Sprint Retrospective).....	44
Feedback	45
Sprint 3	46
Backlog	46
Takverdeling & planning.....	48
Scrum Bord	51
Timesheets	54
Daily scrums.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Realisaties (Sprint Review)	59
Leerpunten (Sprint Retrospective).....	62
Feedback	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Sprint 4	65
Backlog	65
Takverdeling & planning.....	67
Scrum Bord	69
Timesheets	70

Daily scrums.....	71
Realisaties (Sprint Review)	73
Leerpunten (Sprint Retrospective).....	78
Feedback	81
Het eindresultaat.....	82
Functionaliteiten.....	82
Huisstijl.....	83
Foutmeldingen.....	83
Testen.....	83
Oplevering Product Backlog	83
Eindreflectie	85
Werkverdeling in het team.....	85
Teamsamenwerking.....	85
Technische realisatie, uitdagingen en problemen.....	85
Persoonlijke reflectie	85


HET TEAM

Teamnr: 05


Ledenen: Emre, Tacettin, Emma, Fatma



Emre Ilbay
1PROE

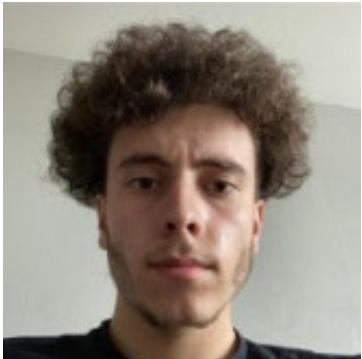

Tacettin Kumas
2PROB

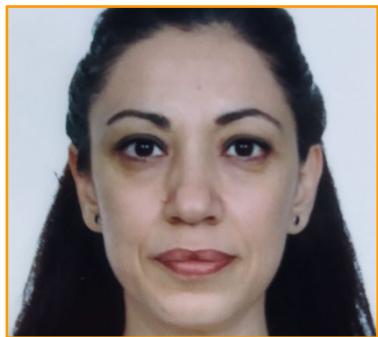

Fatma Kaya
1PROJ



Emma Jammaers
1PROJ

PROJECT INTRODUCTIE

Identiteit

Depo©

Ook bekend als DenOpschlagh™.



Voorstelling

Wij bieden Garages en containers (en tuinen?) te huur.

Containers kunnen geplaatst worden aan huis. Garages zijn vast en zijn op onze locaties beschikbaar. Deze zijn beveiligd met camera's en toezicht, zodat iedereen met een gerust hart hun spullen bij ons kunnen opbergen.

PRODUCT BACKLOG - VOLLEDIG PROJECT

1 Technische setup	Azure Devops omgeving installeren per team (1 Workitem)	voorbereiding
2 Technische setup	SQL Server lokale installatie (1 workitem) (5 taskitems)	voorbereiding
3 Technische setup	SQL Server Management Studio (1 workitem) (5 taskitems)	voorbereiding
4 Technische setup	Microsoft Teams - Team config	voorbereiding
5 Technische setup	Git - Azure Devops Repository aanmaken (1 workitem) (4 Tasks - Clone Repository)	sprint 1
6 Technische setup	Backend - Visual Studio ASP.Net Core API	sprint 1
7 Technische setup	Backend - Visual Studio - Wpf app	sprint 1
8 Technische setup	Backend - Visual Studio - Class Library: incl. API UserController	sprint 1
9 Technische setup	SQL Server lokale installatie (1 workitem) (5 taskitems)	sprint 1
10 Technische setup	SQL Server - Create Table in local DB	sprint 1
11 Technische setup	SQL Server - connect PXL database	sprint 1
12 Technische setup	Frontend	sprint 1
13 Technische setup	Individuele opdracht - technische setup	sprint 1
14 Home page	Als beheerder wil ik dat de website wordt opgemaakt met vaste standaarden qua logo, kleurgebruik enz zodat het voldoet aan de huisstijl	sprint 1
15 Home page	Als gebruiker wil ik op de site duidelijk kunnen zien welke producten (kamer, vakantiehuisje, tuingerief, ...) er te huur zijn. Dit moeten nog geen specifieke producten zijn, maar eerder een algemene omschrijving.	sprint 1
16 Home page	De pagina's van de website moeten "Mobile first" ontworpen zijn. Alle pagina's van de website moeten bruikbaar zijn op een breed scala aan apparaten (desktops en mobiele telefoons).	sprint 1
17 Home page	Als visitor van de website wil ik op een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke homepagina terechtkomen die er mooi verzorgd en professioneel uit ziet en meteen duidelijk aangeeft waarvoor de website dient en wat je er kan huren.	sprint 1
18 Home page	Als gebruiker moet ik de contactgegevens van het bedrijf achter de website kunnen raadplegen (hoe en wanneer zijn ze bereikbaar)	sprint 1
19 Home page	Individuele opdracht sprint 1	sprint 1
20 User login	Een bezoeker moet een profiel kunnen aanmaken op de website met de gegevens en zich zo als gekende gebruiker (klant) melden zodat je later kan aanloggen.	sprint 2
21 User login	Als klant moet ik me kunnen aanmelden op de pagina met userid of e-mail adres.	sprint 2
22 User login	Als klant kan ik me afmelden van de pagina	sprint 2
23 User login	Als gebruiker van de pagina moet ik de juiste rechten toegewezen krijgen van wat ik mag op de site. (Tip: denk na over de soorten gebruikers: bezoekers, klanten/gekende gebruikers, verhuurders, administrator), en moeten vervolgens de juiste dingen afgeschermd staan.	sprint 2
24 User login	Als klant van de website wil ik mijn profielgegevens kunnen raadplegen	sprint 2
25 User login	Als klant van de website wil ik mijn profielgegevens kunnen aanpassen	sprint 2
26 User login	Als klant van de website moet ik kunnen kiezen dat ik mijn paswoord wil wijzigen.	sprint 2
27 User login	Als ik mijn paswoord wil veranderen, moet er een e-mail gestuurd worden naar mijn mail-adres met een link om de aanpassing te bevestigen.	sprint 2
28 User login	Een gebruiker kan naar een andere pagina gaan en aangemeld blijven. (Opm: de andere pagina's moet je nog niet maken, 1 lege pagina waarna je navigeert is OK.)	sprint 2
29 User login	Individuele opdracht sprint 2	sprint 2
30 Product	Als gebruiker wil ik kunnen zien welke producten ik kan huren, met detailgegevens over wat ik kan huren, en de prijs.	sprint 3
31 Product	Maak op de product pagina een product card (met kenmerken van het product) die je op dynamische wijze genereert op basis van een producten dataset.	sprint 3
32 Product	Als een gebruiker een product wilt huren moeten de wel en niet beschikbare dagen om het product te huren zichtbaar worden gemaakt op een kalender.	sprint 3
33 Product	Een gebruiker of bezoeker kan gedetailleerde productinfo raadplegen.	sprint 3
34 Product	Een gebruiker of /bezoeker moet producten kunnen filteren via categorieën die relevant zijn als zoekcategorie.	sprint 3
35 Product	Een gebruiker of bezoeker kan producten selecteren die hij wil huren. Denk goed na over welke zoekcriteria relevant zijn in jouw situatie (welke kenmerken hebben de producten / waarop zou een bezoeker willen kunnen selecteren).	sprint 3
36 Product	Een gebruiker kan de periode aanduiden van de huur (eventueel op een kalender). (voor huur van een product: met begin en einde van de verhuring; voor een vakantiehuisje: aankomst- en vertrekkedatum).	sprint 3
37 Product	Indien vakantiehuisje of van toepassing: als bezoeker moet je je reisgezelschap kunnen aanduiden (x volw, x kinderen, x baby's, x huisdieren)	sprint 3
38 Product	Een verhuurder van de website kan een product dat kan verhuurd worden, toevoegen op de site	sprint 3
39 Product	Een verhuurder van de website kan productgegevens aanpassen	sprint 3
40 Product	Een gebruiker moet een nog niet gereserveerd product in een winkelmandje kunnen plaatsen of kunnen boeken (vakantiehuisje)	sprint 3
41 Product	Als klant wil ik het bestellingsoverzicht kunnen raadplegen.	sprint 3
42 Product	Als klant wil ik producten aan het bestellingsoverzicht kunnen toevoegen en verwijderen	sprint 3
43 Product	Individuele opdracht sprint 3	sprint 3

44 Bestelling	Als klant wil ik de gewenste hoeveelheid of keuze van een product kunnen aanpassen.	sprint 4
45 Bestelling	Als klant wil ik de totale hoeveelheid van productartikelen kunnen raadplegen en de totale prijs die ik zal betalen.	sprint 4
46 Bestelling	Als klant kan ik wil ik kunnen overgaan tot bevestiging van de reservatie voor huur van een artikel.	sprint 4
47 Bestelling	Ik moet een keuze kunnen verwijderen uit de winkelmand voor de bestelling geplaatst is.	sprint 4
48 Bestelling	Voor ik mijn reservatie plaats, zal ik deze altijd moeten bevestigen, of kan ik ook annuleren (in bv het order-overzicht-scherm)	sprint 4
49 Bestelling	Als klant ontvang ik een mail met de bevestiging van mijn reservatie voor huur van een product.	sprint 4
50 Bestelling	Als klant wil ik kunnen aanduiden waar ik het product of de sleutel kan afhalen.	sprint 4
51 Bestelling	Als klant wil ik kunnen kiezen of ik mijn kaartgegevens bewaar op de site of niet.	sprint 4
52 Bestelling	Individuele opdracht sprint 4	sprint 4
53 Uitbreiding	Bouwen van een "vue"-versie van productpagina (Vue.js biedt developers de mogelijkheid om dynamische, interactieve websites en applicaties te creëren.)	optioneel
54 Uitbreiding	Als bezoeker wil ik kunnen zien welke promoties ter beschikking zijn of welke last minutes ik kan boeken.	optioneel
55 Uitbreiding	Als klant wil ik feedback kunnen geven na een verhuring door een beoordeling te scoren en commentaar in te vullen.	optioneel
56 Uitbreiding	Gebruik SASS voor het schrijven van de CSS. Opgelet, hier is ook een build engine voor nodig	optioneel
57 Uitbreiding	Een productcard heeft een Call To Action waardoor het voor de bezoeker duidelijk is dat er naar een detailpagina van het product kan gegaan worden	optioneel
58 Uitbreiding	Maak gebruik van hovereffecten of andere dynamische toevoegingen voor een optimale gebruikerservaring	optioneel

PLAN VAN AANPAK

- Wie is verantwoordelijk voor welke zaken?
- Emre en Emma zijn de hoofdprogrammeurs. Tacettin en Fatma helpen waar nodig, maar zijn vooral bezig met de documentatie en planning.
- Waarom is deze taakverdeling zo?
- We hebben de taken gebaseerd op wie het meest gespecialiseerd is in de taak.
- Welk overleg is er gepleegd?
- Na overleg over het te realiseren project zijn we het eens geworden over het idee om een (opslagruimte) depotverhuurwebsite te maken. Om het vastgestelde idee te realiseren, hebben we eerst de punten bepaald die de bouwstenen van de website gaan vormen (welke soorten opslagruimtes zullen beschikbaar zijn, wat de huurvoorwaarden kunnen zijn, wat de te leveren diensten op de magazijnruimtes zouden kunnen zijn...etc). In lijn met de vastgestelde issues is er door de teamleden overeenstemming bereikt over de taken in de product backlog en is de taakverdeling gemaakt.
- Welke prioriteiten hebben jullie vastgelegd?
- De prioriteiten zijn: een goed communicatie hebben in het team, goed overleggen en vragen stellen indien nodig, tijdig beginnen en gestructureerd werken.
- Welk team afspraken hebben jullie gemaakt?
- Een goed communicatie hebben in het team, goed overleggen en vragen stellen indien nodig, tijdig beginnen en gestructureerd werken.
- Welke (extra) platformen hebben jullie gebruikt? Waarom?
- Discord voor snelle communicatie
- Hoe en waar bewaren jullie documenten, deliverables, tijdelijke werk documenten, ...?
- Op teams en GitHub

SPRINT 1

Backlog

Issue ID	Taak	Beschrijving sprint Item (taak)
10	56,57,58,59	Github Azure devops repo maken
12	55	ASP.net core api
16	54	Backend VS – WPF app
18	53	Backend VS Class lib incl api usercontroller
19	49,50,51,52	SQL server locale installatie
20	64,65,66,67	SQL Server Create table in local DB
21	45,46,47,48	SQL server connect PXL database
23	60,61,62,63	Technische setup
22	73	Frontend technische setup
31	39	Het voorbereiden van logo-ideeën in verschillende vormen
31	42	Hergebruikbare classes in CSS. vaste kleurwaarde.
32	40,75,88,89	Foto's of informatie over producten verzamelen voor de website
33	41	De pagina's van de website "Mobile first" ontworpen zijn.
	90	Navbar en footer mobile compatible maken
34	72	Op een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke homepagina.
35	71, 74	De contactgegevens van het bedrijf achter de website kunnen raadplegen
36	43,68,69,70	Individuele opdracht sprint 1

Taakverdeling & planning

Issue ID	Taak	Member(s)	Geschatte tijd (u)
10	56	Tacettin Kumas	
	57	Emma Jammaers	
	58	Fatma Kaya	
	59	Emre Ilbay	
12	55	Emre Ilbay	
16	54	Emre Ilbay	
18	53	Emre Ilbay	
19	49	Fatma Kaya	
	50	Tacettin Kumas	
	51	Emre Ilbay	
	52	Emma Jammaers	
20	64	Emre Ilbay	
	65	Emma Jammaers	
	66	Tacettin Kumas	
	67	Fatma Kaya	
21	45	Fatma Kaya	
	46	Tacettin Kumas	
	47	Emma Jammaers	
	48	Emre Ilbay	
22	73	Tacettin Kumas	
23	60	Emma Jammaers	
	61	Fatma Kaya	
	62	Tacettin Kumas	
	63	Emre Ilbay	
31	39	Tacettin Kumas	

	42	Emre Ilbay	
32	40	Fatma Kaya	
	75	Fatma Kaya	
	88	Fatma Kaya	
	89	Emma Jammaers	
33	41,90	Emre Ilbay	
34	72	Emre Ilbay	
35	71	Emma Jammaers	
	74	Emma Jammaers	
36	43	Tacettin Kumas	
	68	Emma Jammaers	
	69	Fatma Kaya	
	70	Emre Ilbay	

Scrum Bord

To Do		Doing	Done
36 individuele opdracht Unassigned State: To Do	43 individuele opdracht Tacettin Kumas State: To Do		68 individuele opdracht Emma Jammaers State: Done
35 Homepagina-Contactgegevens Unassigned State: To Do	69 individuele opdracht Fatma Kaya State: To Do		70 individuele opdracht Emre Ilbay State: Done
34 design website Unassigned State: Done			71 De contactgegevens van het bedrijf! Emma Jammaers State: Done
33 website Mobile maken Unassigned State: To Do	90 navbar en footer mobile compatible maken Emre Ilbay State: Doing		72 Aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke hoofdpagina Emre Ilbay State: Done
32 website producten Fatma Kaya State: To Do			41 Mobiel te ontwerpen. Emre Ilbay State: Done
			40 Homepagina-Foto's of informatie Fatma Kaya State: Done
			75 onderberekende onderdeel van producteninformatie Fatma Kaya State: Done
To Do		Doing	Done
31 Opmaak Website Unassigned State: Done			88 Een pagina van soorten producten(Keuzehulp) toevoegen Fatma Kaya State: Done
			89 aanbod vastleggen Emma Jammaers State: Done
			39 Logo-ideeen in verschillende vormen Tacettin Kumas State: Done
			42 Hergebruikbare classes in CSS. Vaste kleurwaarde. Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> ▶ technische setup ▶ Frontend ▶ connect PXL database ▶ Create Table ▶ installatie ▶ Class Library: incl. API UserController ▶ Wpf app ▶ ASP.Net Core API ▶ Repository aanmaken 			

Timesheets

Fatma Kaya

22/02/2023

Wed, Feb 22							Total: 07:35:00	
Logboek/Azure DevOps taken toewi...	● WPL 2 website	Sprint1	\$	15:30 - 17:20		01:50:00		
Technische setup (Individueel en groe...	● WPL 2 website	Sprint1	\$	13:30 - 15:30		02:00:00		
Technische setup individueel en teams...	● WPL 2 website	Sprint1	\$	09:00 - 12:30		03:30:00		
Daily Standup ● WPL 2 website		Sprint1	\$	08:45 - 09:00		00:15:00		

23/02/2023

Feb 20 - Feb 26							Week total: 11:35:00	
Thu, Feb 23							Total: 04:00:00	
Product Sprint backlog verwerken/Azur...	● WPL 2 website	Sprint1	\$	08:45 - 12:30		03:45:00		
Daily Standup ● WPL 2 website		Sprint1	\$	08:30 - 08:45		00:15:00		

01/03/2023

Wed, Mar 1							Total: 08:43:41	
Foto's/producteninfo onderzoeken ● WPL 2 website	Sprint1	\$	16:46 - 17:22		00:35:28			
3 Logboek aanpassen ● WPL 2 website	Sprint1	\$	13:30 - 16:46		04:08:13			
Werken aan producten voor verhuur via d...	● WPL 2 website	Sprint1	\$	08:45 - 12:30		03:45:00		
Daily Standup ● WPL 2 website	Sprint1	\$	08:30 - 08:45		00:15:00			

02/03/2023

Last week							Week total: 12:26:58
Thu, Mar 2							Total: 03:43:17
Logboek aanpassen ● WPL 2 website	Sprint1	\$	11:24 - 12:24		01:00:22		
Foto's/producteninfo onderzoeken ● WPL 2 website	Sprint1	\$	09:01 - 11:23		02:22:45		
Daily Standup ● WPL 2 website	Sprint1	\$	08:40 - 09:01		00:20:10		

08/03/2023

Wed, Mar 8							Total: 07:03:00
Backend Framework Insert ● WPL 2 website	Sprint1	\$	15:15 - 17:10		01:55:10		
Onderberekende onderdeel invullen ● WPL 2 website	Sprint1	\$	09:16 - 13:51		04:35:23		
Daily Standup ● WPL 2 website	Sprint1	\$	08:42 - 09:14		00:32:27		

09/03/2023

This week							Week total: 10:45:24
Thu, Mar 9							Total: 03:42:24
Logboek aanpassen - Leerpunten (Sprint1) ● WPL 2 website	Sprint1	\$	11:59 - 12:26		00:27:11		
Productenpagina(Keuzehulp) ● WPL 2 website	Sprint1	\$	09:24 - 11:57		02:33:24		
Daily Standup ● WPL 2 website	Sprint1	\$	08:41 - 09:23		00:41:49		

Emma Jammaers

22/02/2023 en 23/02/2023: afwezig wegens ziekte; geen tijdsregistratie

01/03/2023

Wed, Mar 1							Total: 05:45:04	
teksten hom...	● WPL 2 web...		\$	16:30 - 17:23		00:52:49		
2 conta...	● WPL 2 web...		\$	11:12 - 15:19		03:32:43		
research con...	● WPL 2 web...		\$	09:52 - 11:11		01:19:32		

02/03/2023

Thu, Mar 2							Total: 03:16:50	
keuzehulp pa...	● WPL 2 web...		\$	10:37 - 12:25		01:48:18		
keuzehulp pa...	● WPL 2 web...		\$	09:02 - 10:31		01:28:32		

08/03/2023

Wed, Mar 8							Total: 07:30:51	
2 over o...	● WPL 2 web...		\$	11:05 - 17:27		05:13:06		
logboek aanv...	● WPL 2 web...		\$	09:58 - 11:05		01:06:37		
over ons pagi...	● WPL 2 web...		\$	09:03 - 09:58		00:55:35		
stand-up 08-...	● stands up		\$	08:47 - 09:02		00:15:33		

09/03/2023

Thu, Mar 9							Total: 02:54:38	
over-ons-pag...	● WPL 2 web...		\$	10:57 - 11:49		00:51:45		
2 aanbo...	● WPL 2 web...		\$	09:02 - 10:57		01:40:39		
aanpassinge...	● WPL 2 web...		\$	08:53 - 09:02		00:08:34		
stand-up 09-...	● WPL 2 webs...		\$	08:39 - 08:52		00:13:40		

Emre Ilbay

22/02/2023

Feb 20 - Feb 26

Week total: 02:44:08

Thu, Feb 23

Total: 02:44:08

bizzy onn da homepage • WPL 2 website



11:33 - 12:27



00:53:47



Backend framework 6 • WPL 2 website



10:06 - 11:04



00:57:32



Project bekijken, analyseren • WPL 2 website



09:04 - 09:57



00:52:49



01/03/2023

Last week

Week total: 12:18:44

Thu, Mar 2

Total: 03:48:39

log in pagina • WPL 2 website



08:58 - 12:30



03:31:48



standup • WPL 2 website



08:36 - 08:53



00:16:51



Wed, Mar 1

Total: 08:30:05

Contact pagina updaten • WPL 2 website



16:15 - 17:30



01:15:00



Homepage Mobile compatible • WPL 2 website



14:45 - 16:00



01:15:00



Homepage Issue • WPL 2 website



08:58 - 14:30



05:32:05



standup • WPL 2 website



08:30 - 08:58



00:28:00



08/03/2023

This week

Week total: 11:49:12

Thu, Mar 9

Total: 03:46:14

sprint retrospect • WPL 2 website



11:47 - 12:28



00:40:11



navbar mobile compatible • WPL 2 website



09:00 - 11:47



02:46:56



standup • WPL 2 website



08:41 - 09:00



00:19:07



Wed, Mar 8

Total: 08:02:58

Kleine aanpassingen frontend • WPL 2 website



16:15 - 16:51



00:36:00



Devops sprint 2 toevoegen • WPL 2 website



15:55 - 16:09



00:14:15



Database/WPF • WPL 2 website



09:25 - 15:53



06:27:43



backlogs • WPL 2 website



09:00 - 09:25



00:25:00



standup • WPL 2 website



08:40 - 09:00



00:20:00



Tacettin Kumas

22/02/2023

Feb 20 - Feb 26

|Week total: 06:50:00

Wed, Feb 22							Total: 06:50:00	
logboek	● logboek	Sprint1	\$	16:00 - 17:20		01:20:00		
technische setup	● WPL 2 website	Sprint1	\$	10:00 - 15:30		05:30:00		

23/02/2023 → Afwezig

01/03/2023

Wed, Mar 1

|Total: 05:57:00

Wed, Mar 1							Total: 05:57:00	
logboek	● logboek	Sprint1	\$	16:00 - 17:15		01:15:00		
azure devops updaten	● WPL 2 website	Sprint1	\$	13:30 - 15:30		02:00:00		
design	● WPL 2 website	Sprint1	\$	09:00 - 11:30		02:30:00		
daily stand up	● stands up	Sprint1	\$	08:35 - 08:47		00:12:00		

02/03/2023

Thu, Mar 2

|Total: 03:26:00

Thu, Mar 2							Total: 03:26:00	
logboek	● logboek	Sprint1	\$	09:06 - 12:16		03:10:11		
daily stand up	● stands up	Sprint1	\$	08:40 - 08:55		00:15:49		

08/03/2023 → Afwezig

09/03/2023

Thu, Mar 9

|Total: 02:32:33

Thu, Mar 9							Total: 02:32:33	
logboek	● logboek	Sprint1	\$	09:30 - 11:47		02:17:59		
daily stand up	● stands up	Sprint1	\$	08:41 - 08:55		00:14:34		

Daily scrums

Scrum woensdag 22/02/2023 8u40

- Emre Ilbay

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

De eerste stappen naar de homepagina is gerealiseerd. Ook heb ik gewerkt aan algemene classes zodat de website er consistent uitziet.

Wat ga je vandaag doen?

Verder afwerken. Pagina's mobile compatible maken. Een eventuele correctie/update uitvoeren op pagina's waar nodig.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik heb geen vooruitzicht.

- Fatma Kaya

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Deze week moesten we ons project, dat we als onderdeel van teamwerk zullen uitvoeren, opnieuw definiëren vanwege het vertrek van een teamgenoot van het project. In deze richting werkten we aan mogelijke ideeën en kwamen we overeen om ons project een Opslagruimte Huren (Depo) website te realiseren.

Wat ga je vandaag doen?

Ik werkte aan het voltooien van de noodzakelijke technische structuurvereisten voor ons project.

- Github Azure devops repo maken
- SQL sever setup
- Technische setup

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Regelmatig bijwerken van logboek en wat te doen was voor mij niet duidelijk genoeg. Ik heb hier technische ondersteuning voor gekregen.

- Emma Jammaers

Afwezig wegens ziekte

- Tacettin Kumaz

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Leren werken met github, azure devops en clockify.

Wat ga je vandaag doen?

Techinsche setup en azure devops verdeling

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Nee

Scrum donderdag 23/02/2023 8u40

- Emre Ilbay

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Hetzelfde als de dag ervoor.

Wat ga je vandaag doen?

Verder afwerken waar ik gisteren mee bezig was.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Neen.

- Fatma Kaya

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Ik heb de installatie van enkele technische eisen afgerond. Maar ik heb nog wat dingen af te ronden.

Wat ga je vandaag doen?

Ik ben verder gegaan met het afwerken van de technische installaties.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen met deze zaken.

- **Emma Jammaers**

Afwezig wegens ziekte

- **Tacettin Kumas**

afwezig

Scrum woensdag 01/03 8u40

- **Emre Ilbay**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

De homepagina is afgewerkt. Ik ben overgestapt naar het corrigeren van de rest van de website. Navbar is ook klaar.

Wat ga je vandaag doen?

Ik kijk vooruit op de wat er nog valt te doen en zie dat ik me al kan focussen op de volgende sprint. Een login pagina is nodig. Ik ben begonnen aan de front-end van onze login.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

:/

- **Fatma Kaya**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Vorige week heeft een teamgenoot van ons zijn uitgeschreven. Om deze reden hebben we alle groepsoperaties herhaald die wie tijdens de voorbereidingsweek hebben gedaan. Ik schreef backlogs van de 1e Sprint en gerelateerde taken op de Azure DevOps. Ik heb vorige week de technische opzet van ons teamproject op Git-Hup en van individuele project afgerond.

Wat ga je vandaag doen?

Ik ga mijn logboek een beetje aanvullen. Vandaag doe ik in de 1e Sprint productinformatie- en visueel onderzoek voor ons website.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen met deze zaken.

- **Emma Jammaers**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Ik was afwezig vorige week en heb nog geen daily stand up meegemaakt.

Wat ga je vandaag doen?

Vandaag zorg ik ervoor dat mijn technische set-up in de nieuwe teamconfiguratie in orde is en help ik alvast met het bouwen van de contact-pagina.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht dat ik mogelijk moeilijkheden zal hebben om de technische set-up in orde te brengen, maar het team kan mij hierbij helpen.

- **Tacettin Kumas**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Leren werken met github, azure devops en clockify.

Wat ga je vandaag doen?

Techinsche setup en azure devops verdeling, helpen met de front end

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Nee

Scrum Donderdag 02/03/2023 8u40

- **Emre Ilbay**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Ik heb deze dag niet echt gereflecteerd.

Wat ga je vandaag doen?

Mijn focus ligt op de login pagina.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

...

- **Fatma Kaya**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Ik heb productinformatie en afbeeldingen verzameld die gebruikt kunnen worden voor de ons website. Ik begon het logboek opnieuw in te delen volgens het werk dat we deden.

Wat ga je vandaag doen?

Ik ga vandaag verder met het schrijven van taakdefinities. Ik zal doorgaan met het doen van informatie- en ontwerponderzoek naar de producten die gepland zijn om op onze website te worden opgenomen en mijn suggesties over dit onderwerp toevoegen door ze te classificeren in ons project op GitHub.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen met deze zaken.

- **Emma Jammaers**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Gisteren heb ik mijn technische set-up op punt gesteld, en heb ik ook een contact-pagina gebouwd voor de website die grotendeels op punt gesteld is.

Wat ga je vandaag doen?

Ik design en bouw een keuzehulp-pagina voor de website volgens de huisstijl.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen bij deze taak.

- **Tacettin Kumars**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Technische setup voldaan

Wat ga je vandaag doen?

Helpen met het design van frontend en het herstellen van Azure devops

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen

Scrum woensdag 08/03/2023 8u40

Fatma Kaya

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Ik werkte aan de informatie en afbeeldingen over de producten en de pagina-indeling en voegde deze als bestand toe aan het project.

Wat ga je vandaag doen?

Ik zal nagaan of er behoefte is aan andere informatie en afbeeldingen die kunnen worden gebruikt en deze indien nodig aanvullen ik zal ook frontend-back-up instellen.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen

Scrum woensdag 09/03/2023 8u40

Emma Jammaers

Gisteren hield ik me bezig met de 'over ons-pagina' en heb ik mijn logboek alvast een beetje aangevuld
Vandaag link ik de over-ons pagina aan de navbar en bepaal ik het aanbod.

Ik verwacht hier geen problemen mee te hebben.

Fatma Kaya**Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?**

Ik gaf informatie en documentondersteuning voor ons project.

Wat ga je vandaag doen?

Ik design en bouw een ontdek-pagina voor de website volgens de huisstijl en ga ik mijn logboek aanvullen.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen.

Tacettin Kumas**Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?**

afwezig

Wat ga je vandaag doen?

Logboek verder werken

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Ik verwacht geen problemen.

Realisaties (Sprint Review)

Website (front-end)

Ruim aanbod opslaggroottes

We beschikken over opslagruimtes in verschillende groottes. Heb je niet veel spullen, dan betaal je niet voor ruimte die je niet gebruikt.

	Opslagruimte type 1,5m² €28 per maand (3,5m ³)	Oppervlakte: 1,5m ² Inhoud: 3,5m ³ Formaat: 1,20x1,20x2,40m (LxBxH)
	Opslagruimte type 2m² €40 per maand (4,5m ³)	Oppervlakte: 2m ² Inhoud: 4,5m ³ Formaat: 1,40x1,40x2,40m (LxBxH)
	Opslagruimte type 3m² €55 per maand (8m ³)	Oppervlakte: 3m ² Inhoud: 8m ³ Formaat:

Contacteer ons

Voor vragen, opmerkingen, enz. kunt u ons gerust contacteren.

Depo DenOpschlagh
Boomstraat 123
3500 Hasselt
0468 / 29 59 33
info@denopschlagh.be

Over ons

Wie zijn wij?
Depo DenOpschlagh is opgestart door een groep vrienden met een passie voor ondernemen. Voor onze spullen vonden we geen geschikte opslagruimte dicht bij huis en besloten we om er dan maar zelf één op te zetten, met geweldige resultaat.

Na vijftien jaar zijn wij uitgegroeid tot één van de meest betrouwbare, geliefde en klantvriendelijke verhuurders van opslagruimtes in Limburg en omstreken.

Wij behandelen u niet alleen als klant, maar zeker ook als vriend – wat dus wil zeggen dat wij met de grootste zorgen met uw goederen omgaan. Als u met een glimlach uw spullen achterlaat, zijn wij tevreden!

Onze missie
Bij Depo DenOpschlagh voorzien we je steeds van de meest geschikte opslagruimte. Je kan jouw materiaal veilig bij ons laten bewaren in goed geventileerde, verwarmde, vocht- en vorstvrije ruimtes.

Keuzehulp

Als je iets wilt oplaan, of dat nu kleine of grote zaken zijn, heb je de juiste opslagruimte nodig. Weet je niet waar je moet beginnen? Geen probleem! Met de volgende tips kom je er stapsgewijs achter wat de beste opslagkeuze is voor jouw bezittingen.


1. Hoe lang heb je de opslagruimte nodig?
Voor je een contract afsluit, is het natuurlijk belangrijk even na te denken over hoe lang je een opslagruimte nodig hebt. Of je nu verhuist of een (tijdelijke) opslagruimte nodig hebt voor andere redenen, de lengte van je huur kan een doorslaggevende rol spelen in je keuze.

2. Hoeveel opslagruimte heb je precies nodig?
Wees er zeker van dat je het goede formaat van opslagruimte huurt. Is deze te klein, dan loop je het risico op beschadiging omdat je je goederen in de opslagruimte zult moeten proppen. Bij een te grote ruimte verspil je dan weer teveel ruimte en geld. Laat je bijstaan door een professioneel bedrijf, zij zullen je het best kunnen adviseren.

3. Wat is het doel van de opslag?
Je zult een ander type opslagruimte nodig hebben wanneer je verhuist en wanneer je wat extra opslagruimte nodig hebt. Vaak is er nood aan een tijdelijke opslagruimte tijdens een verhuis. Indien je niet verhuist en gewoon wat extra tijdelijke ruimte nodig hebt, dan zoek je best naar een opslagplaats in de buurt van je huidige woonst.

Hoe is slechts een beperkte opladecapaciteit nodig? Of vind je het belangrijk om ten alle tijden toegang te hebben tot de opladeplaats? Geen



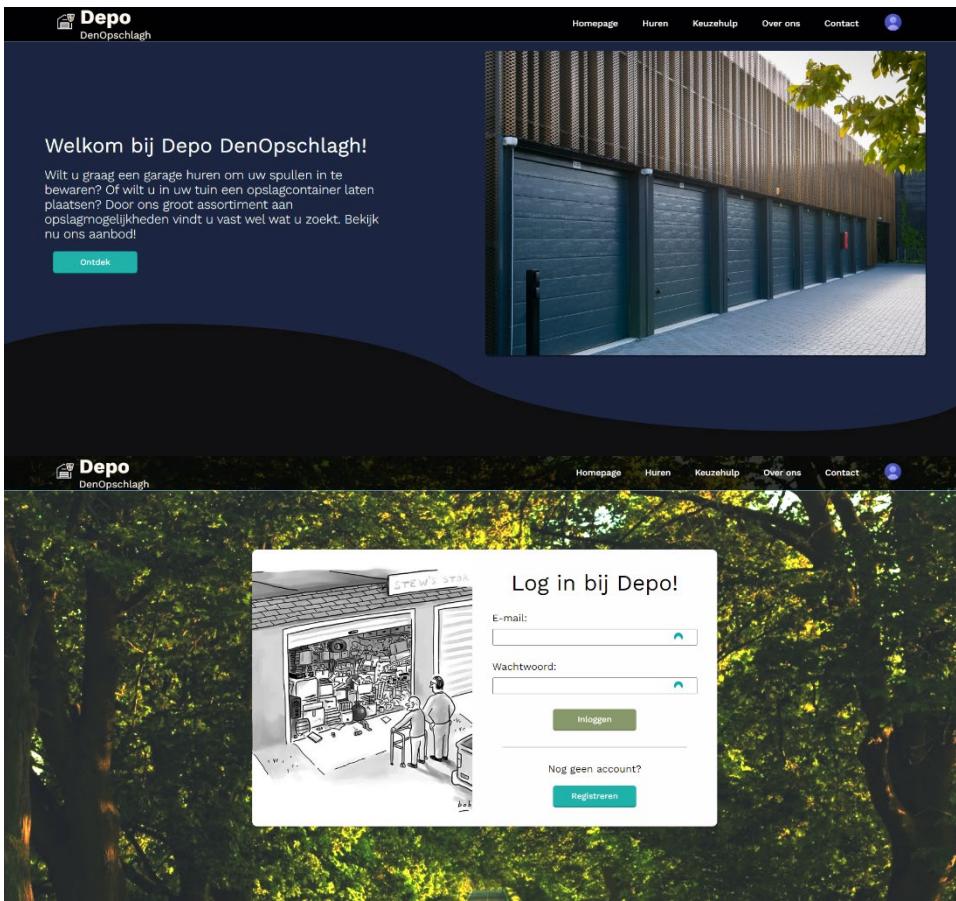

Wireframe


Er is nog geen visualisatie van de website.

Class Library (optioneel)

/

Database

Invoegen: database schets

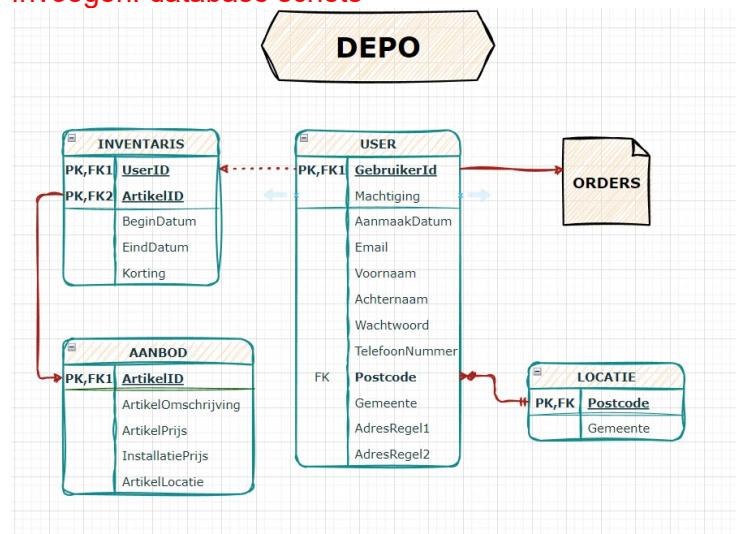

Leerpunten (Sprint Retrospective)

Op het EINDE VAN DE SPRINT bespreek je de leerpunten:

1. Wat ging goed?

Daily stand ups, duidelijke communicatie

2. Wat ging minder goed en waarom?

Vage takenverdeling: een teamlid zich heeft uitgeschreven, maar we schakelden snel over

3. Wat wil je verbeteren in volgende sprint?

Betere takenverdeling en aanduiding via scrumbord + aankondiging wie er met wat bezig is

Enkele specifieke punten die je ook bespreekt:

- Hoe verliep het technisch werk?
- goed
- Welke opdrachten gingen goed? Over welke realisaties ben je tevreden?
- Algemeen goed
- Welke opdrachten verliepen moeilijk en waarom?
- Vb. het gebruiken van javascript is moeilijk wegens tekort aan leerstof.
- Welke technische kennis kom je tekort en wat ga je daaraan doen?
- javascript, vragen aan lectoren voor hulp en opzoeken.
- Zeer belangrijk: welk zijn hieruit je actiepunten voor volgende sprint

Voor sommige personen ging het goed, voor anderen wat minder. We gaan kijken of we een duidelijker taakverdeling en –communicatie kunnen hanteren, en of we gaan bepalen of de leden van ons team een duidelijke rol als front-end of back-end developer op zich neemt.

- Hoe verliepen daily stand ups?
- Vrij vlot.
- Wat ging er goed in de samenkomst?
- Communicatie,
- Wat ging er moeilijk?
- Taak verdeling
- Wat willen jullie behouden en wat anders doen?
- We verstaan mekaar, maar weten niet wie wat moet doen.

- Hoe verliep het invullen van de rol van scrum master? (enkel in te vullen door de scrum master)
- Wie was scrum master?
- Emre
- Hoe heb je dit ervaren? Wat ging goed? Wat ging minder goed?
- Catastrophique
- Hoe hebben de anderen jou ervaren als scrum master? (vraag feedback)

- ja
 - Ligt dit jou of minder? Geef uitleg bij je mening.
 - Nee ik hou me er niet graag mee bezig.
 - Welke tip geef je mee aan de volgende scrum master?
 - Ik heb echt geen tips.
-
- Hoe verliep de samenwerking in je groep?
 - Is jullie groep al een team?
 - Waarom wel/waarom niet?
Nog niet, omdat we eigenlijk nog niet specifiek als team iets samen hebben gedaan.
 - Wat is er nog nodig volgens jou?
Taal verdeling en samenwerking
 - Hoe verliep de communicatie onderling?
Goed maar moet beter
 - Hebben jullie nieuwe groepsafspraken? Zo ja, welke? Noteer deze in het DevOps Scrum bord.
Niet zo specifiek
 - Hebben jullie elkaar geholpen of heb je hulp ondervonden? Welke hulp is er gegeven?
Samen leren werken met github en azure devops.

Feedback

Team

Noteer hier de feedback die jullie ontvingen van coaches of medestudenten rond je werk; tijdens sessies of tijdens de evaluatie. Feedback rond punten waar je technisch sterker in moet worden, feedback op aanpak of samenwerking, of ... Feedback kan zowel positief zijn als wijzen op verbeterpunten.

Individueel

Iedereen uit het team noteert persoonlijk de feedback die hij/zij heeft gehad. Bekijk voor jezelf hoe je ermee aan de slag gaat. Op het einde van WPL2 zal je al je feedback moeten samennemen en terugblikken op je totale evolutie in je eindreflectie.

woensdag 22/02/2023 8u40

Emre Ilbay

De feedback die we ontvingen gingen vooral rond planning/takenverdeling en devops.
Ik vind dat we hier moeite mee hebben.

Fatma Kaya

We hebben kanalen geïdentificeerd via welke we met elkaar kunnen communiceren in de zakelijke omgeving en tijdens het individueel werken. Op deze manier begon het bewustzijn om een team te zijn zich in de eerste plaats voor mij te vormen.
Toen een van onze teamleden het project verliet, moesten de beslissingen en acties die als team namens het project werden genomen, opnieuw door het team worden besproken.
Deze situatie zorgde bij mij voor een afname van de motivatie.

Fatma Kaya

We bespraken onze ideeën door te brainstormen over het onderwerp waarover we ons project gaan maken. Zo werd het besloten projectidee door alle leden overgenomen.

Scrum woensdag 01/03/2023 8u40

Fatma Kaya

In lijn met de gedefinieerde taken wordt feedback gegeven door andere teamleden of er gebieden zijn die goed zijn of verbetering behoeven. Dit houdt me dicht bij het verwachte resultaat in mijn missie.

Scrum donderdag 02/03/2023 8u40

Fatma Kaya

Het creëren van testcriteria voor de taken die binnen het project zijn voltooid, kan het mogelijk maken resultaten te verkrijgen die dichter bij het doel liggen voor de volgende taken.

Scrum woensdag 08/03/2023 8u40

Fatma Kaya

Teamleden proberen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Sommige taken kunnen langer duren dan verwacht.

Scrum donderdag 09/03/2023 8u40

Fatma Kaya

Het bepalen van prioriteiten van userstories kan zorgen voor efficiënter werken. Het detailleren van het werk dat moet worden gedaan, maakt het voor mij gemakkelijker om de taak uit te voeren.

Emma Jammaers

Doorheen deze sprint heb ik te horen gekregen dat ik beter met mijn team mag aanspreken als ik ergens vast mee zit. Ook de user stories zullen helpen om een betere visie te krijgen op wie met wat bezig is en zo het overzicht te kunnen behouden.

SPRINT 2

Backlog

Issue ID	Taak	Beschrijving sprint Item (taak)
01	01	Css file van de "aanvraag verzenden" button moet aangepast worden.
	02	De "annuleren" button moet een "href" krijgen.
02	01	Willekeurige openingen in tekst.
	02	De grootte van de afbeelding moet kleiner.(beter design)
03	01	Het is niet duidelijk of het gaat over containers of garages.
	02	De hover effect moet veranderen
04	01	Vermijden van breaks
	02	Naming Conventions
	03	Vermijden van breaks
	04	Naming Conventions
05	01	Het paragraph moet horizontaal centreren.
	02	Logo in de navbar moet aangepast worden in CSS
	03	De footer moet aangepast worden
	04	Afbeeldingen in html zijn niet mobile compatibility.
06	01	Database Maken voor gebruikers
	02	Een fully functional login window voor de admins (WPF)
	03	WPF APP Herschrijven en Code in Classes stoppen.
	04	Documentatie review
07	01	User login - Aangemeld blijven
08	01	User login - Bevestiging gewijzigde wachtwoord
09	01	Login pagina aanpassen
	02	Wachtwoord wijzigen pagina ontwerp
	03	Ontdek pagina opnieuw aanpassen
	04	Wachtwoord pagina opnieuw build

	05	Over Fetch Api onderzoek doen
	06	Ontdek pagina mobiel te ontwerpen
10	01	Een script schrijven met fetch Api (PUT)
11	01	Profielpagina ontwerp
	02	Profielpagina build
	03	Aanpassen van de profielpagina
12	01	User login - Rechten/Machtigingen
13	01	User login - Afmelden
14	01	API dat de login verzoeken verwerkt
	02	Input omzetten in een fetch
	03	De fetch posten
	04	Een session krijgen om ingelogd te blijven
15	01	Registratie pagina

Taakverdeling & planning

Issue ID	Taak	Member(s)	Geschatte tijd (u)
01	01	Fatma Kaya	2u
	02	Fatma Kaya	1u
02	01	Emma Jammaers	2u
	02	Emma Jammaers	1u
03	01	Fatma Kaya	1u
	02	Fatma Kaya	2u
04	01	Fatma Kaya	1u
	02	Fatma Kaya	1u'
04	03	Emma Jammaers	1u
	04	Emma Jammaers	1u
05	01	Fatma Kaya	1u
	02	Fatma Kaya	1u
05	03	Fatma Kaya	1u
	04	Fatma Kaya	1u
06	01	Emre Ilbay	
	02	Emre Ilbay	
06	03	Tacettin Kumas	5u
	04	Emre Ilbay	
06	05	Tacettin Kumas	1u
	01	Tacettin Kumas	4u
08	01	Fatma Kaya (Voor Issue algemeen schatting. Er is nog niet taakverdeling)	8u
09	01	Fatma Kaya	2u'
	02	Fatma Kaya	2u
09	03	Fatma Kaya	2u
	04	Fatma Kaya	2u
09	05	Fatma Kaya	5u
	06	Fatma Kaya	1u

10	01	Fatma Kaya	3u
11	01	Emma Jammaers	1u
	02	Emma Jammaers	1u
	03	Tacettin Kumas	1u
12	01	Tacettin Kumas	2u
13	01	Tacettin Kumas	2u
14	01	Emre Ilbay	
	02	Tacettin Kumas	2u
	03	Tacettin Kumas	3u
	04	Tacettin Kumas	2u
15	01	Tacettin Kumas	2u

Scrum Bord

PXL2023PlanningToolTeam05 Team			Sprint 2	Person: All	
To Do	Doing	Done			
<p>121 In de "account herstel" html pagina Fatma Kaya State: To Do</p> <p>119 In de "over ons" html pagina Emma Jammaers State: To Do</p> <p>116 In de "ontdek-hier" html pagina Fatma Kaya State: To Do</p> <p>111 algemene aanpassingen Unassigned State: To Do</p>		<p>122 Css file van de "aanvraag verzenden" button moet aangepast worden. Fatma Kaya State: Done</p> <p>113 Willekeurige openingen in tekst. Emma Jammaers State: Done</p> <p>117 Het is niet duidelijk of het gaat over containers of garages. Fatma Kaya State: Done</p> <p>112 vermeiden of breaks Fatma Kaya State: Done</p> <p>126 vermeiden of breaks Emma Jammaers State: Done</p>	<p>123 De "annuleren" button moet een href krijgen. Fatma Kaya State: Done</p> <p>120 De grootte van de afbeelding moet kleiner (better design) Emma Jammaers State: Done</p> <p>118 De hover effect moet veranderen Fatma Kaya State: Done</p> <p>115 NAMING CONVENTIONS Fatma Kaya State: Done</p> <p>127 NAMING CONVENTIONS Emma Jammaers</p>		
<p>107 mobile compatibility: Elementen moeten goed schikken op kleinere schermen Unassigned State: To Do</p> <p>85 User Login - Individuele opdracht sprint 2 Unassigned State: To Do</p> <p>84 User login - Aangemeld blijven Unassigned State: To Do</p>		<p>108 Het paragraph moet horizontaal centreren. Fatma Kaya State: Done</p> <p>110 De footer moet aangepast worden Fatma Kaya State: Done</p> <p>86 Database Maken voor gebruikers Emre Ibay State: Done</p> <p>100 WPF APP Herschrijven en Code in Classes stoppen. Emre Ibay State: Done</p>	<p>109 Logo in de navbar moet aangepast worden in css Fatma Kaya State: Done</p> <p>114 Afbeeldingen in html zijn niet mobile compatibility. Fatma Kaya State: Done</p> <p>87 Een fully functional login window voor de admins (WPF) Emre Ibay State: Done</p> <p>106 documentatie review Tacettin Kumars State: Done</p>		
<p>83 User login - Bevestiging gewijzigde wachtwoord Fatma Kaya State: To Do</p> <p>82 User login - Wachtwoord wijzigen Unassigned State: To Do</p> <p>81 User login - Profielgegevens Aanpassen Fatma Kaya State: To Do</p>	<p>104 Over Fetch Api onderzoek doen Fatma Kaya State: Doing</p>		<p>91 Login pagina aanpassen Fatma Kaya State: Done</p> <p>102 Ontdek pagina opnieuw aanpassen Fatma Kaya State: Done</p> <p>105 Ontdek pagina mobiel te ontwerpen Fatma Kaya State: Done</p> <p>134 Een script schrijven met fetch Api (PUT) Fatma Kaya State: Doing</p>	<p>101 Wachtwoord wijzigen pagina ontwerp Fatma Kaya State: Done</p> <p>103 Wachtwoord pagina opnieuw build Fatma Kaya State: Done</p>	

To Do		Doing	Done
80 User login - Profielgegevens raadplegen Unassigned State: Doing			92 profielpagina ontwerp Emma Jammars State: Done
79 User login - Rechten/Machtigingen Unassigned State: To Do	135 rechten en machtigingen verwezen Tacettin Kumaz State: To Do		130 aanpassen van de profielpagina Tacettin Kumaz State: Done
78 User login - Afmelden Unassigned State: To Do	136 session end Tacettin Kumaz State: To Do		
77 User login - Aanmelden Unassigned State: To Do	132 de fetch posten Tacettin Kumaz State: To Do	133 een session krijgen om ingelogd te blijven Tacettin Kumaz State: Doing	129 API dat de login verzoeken verwerkt Emre Ilbay State: Done
			131 input omzetten in een fetch Tacettin Kumaz State: Done

Timesheets

Emma Jammaers

15/03/2023

Wed, Mar 15							Total: 07:00:00	
profielpagina data ra...	● WPL 2 web...		\$	15:01 - 17:12		02:10:25		
2 profielpagina ...	● WPL 2 web...		\$	10:49 - 15:01		02:41:05		
profielpagina ontwe...	● WPL 2 websi...		\$	09:12 - 10:49		01:37:06		
stand-up 15-03 + be...	● WPL 2 web...		\$	08:41 - 09:12		00:31:24		

16/03/2023

Thu, Mar 16							Total: 03:46:40	
API project	● WPL 2 website		\$	09:39 - 12:26		02:47:42		
uitleg APIs	● WPL 2 website		\$	09:06 - 09:39		00:32:28		
stand-up 16-03	● WPL 2 website		\$	08:40 - 09:06		00:26:30		

22/03/2023

Wed, Mar 22							Total: 06:33:43	
over-ons/keuzehulp ...	● WPL 2 web...		\$	14:59 - 17:19		02:20:29		
c# troubleshooting	● WPL 2 website		\$	13:36 - 14:59		01:22:37		
cs-files	● WPL 2 website		\$	09:54 - 12:31		02:36:43		
daily stand-up 22/03	● WPL 2 website		\$	09:40 - 09:53		00:13:54		

23/03/2023

Thu, Mar 23							Total: 03:00:28	
fetch API verder lere...	● WPL 2 web...		\$	11:56 - 12:30		00:33:59		
over-ons/keuzehulp ...	● WPL 2 web...		\$	09:29 - 11:55		02:26:29		

29/03/2023

Wed, Mar 29							Total: 02:47:25	
fetch API	● WPL 2 website		\$	09:27 - 11:35		02:07:59		
controle/test opgave...	● WPL 2 web...		\$	08:50 - 09:26		00:35:56		
stand-up 29-03	● WPL 2 website		\$	08:46 - 08:50		00:03:30		

11:35 Naar huis gegaan wegens ziekte

30/03/2023

Afwezig wegens ziekte

Fatma Kaya

15/03/2023

Wed, Mar 15		Total: 06:46:40					
Informatie research over Data connection	• WPL 2 website	\$	15:45 - 17:12	15:45 - 17:12	01:27:00	01:27:00	01:27:00
Informatie onderzoeken over Data creëren	• WPL 2 website	\$	13:36 - 15:15	13:36 - 15:15	01:38:10	01:38:10	01:38:10
Sprintreview van Sprint1 voorbereiden en Sprint1 ...	• WPL 2 web...	\$	10:20 - 12:30	10:20 - 12:30	02:09:18	02:09:18	02:09:18
Informatie onderzoeken over Data creëren en Da...	• WPL 2 web...	\$	09:15 - 10:14	09:15 - 10:14	00:58:47	00:58:47	00:58:47
Daily Standup	• WPL 2 website	\$	08:36 - 09:10	08:36 - 09:10	00:33:25	00:33:25	00:33:25

16/03/2023

Mar 13 - Mar 19		Week total: 11:21:38					
Thu, Mar 16		Total: 03:31:01					
Register pagina aanpassen	• WPL 2 website	\$	09:51 - 12:13	09:51 - 12:13	02:21:18	02:21:18	02:21:18
Daily Standup	• WPL 2 website	\$	08:41 - 09:51	08:41 - 09:51	01:09:43	01:09:43	01:09:43

22/03/2023

Wed, Mar 22		Total: 06:41:01					
Css file van de "aanvraag verzenden" button moet aangepast worden.	• WPL 2 website	\$	15:26 - 17:09	15:26 - 17:09	01:43:05	01:43:05	01:43:05
De "annuleren" button moet een href krijgen.	• WPL 2 website	\$	14:55 - 15:25	14:55 - 15:25	00:30:51	00:30:51	00:30:51
sprint 1 beoordelen	• WPL 2 website	\$	10:15 - 10:52	10:15 - 10:52	00:36:59	00:36:59	00:36:59
3 Ontdek pagina opnieuw aanpassen	• WPL 2 website	\$	09:40 - 14:54	09:40 - 14:54	02:54:33	02:54:33	02:54:33
Daily Standup	• WPL 2 website	\$	08:43 - 09:39	08:43 - 09:39	00:55:33	00:55:33	00:55:33

23/03/2023

Last week		Week total: 08:43:45					
Thu, Mar 23		Total: 02:02:44					
Ontdek pagina mobiele compatibiliteit	• WPL 2 website	\$	10:21 - 12:24	10:21 - 12:24	02:02:44	02:02:44	02:02:44

29/03/2023

Wed, Mar 29		Total: 05:14:32					
Over Fetch Api onderzoek doen	• WPL 2 website	\$	16:45 - 17:19	16:45 - 17:19	00:33:46	00:33:46	00:33:46
Logboek/Azure DevOps taken toewijzen	• WPL 2 website	Sprint1	\$	13:32 - 15:03	13:32 - 15:03	01:30:32	01:30:32
Mobile compatibility van afbeeldingen in html	• WPL 2 website	\$	09:22 - 12:15	09:22 - 12:15	02:52:46	02:52:46	02:52:46
Daily Standup	• WPL 2 website	\$	08:45 - 09:03	08:45 - 09:03	00:17:28	00:17:28	00:17:28

30/03/2023

This week

Week total: 08:45:32

Yesterday								Total: 03:31:00			
Gegevens wijziging	• WPL 2 website			\$		10:45 - 11:59		01:14:00			
Wachtwoordswijziging pagina ontwerpen	• WPL 2 website			\$		09:30 - 11:47		02:17:00			

Emre Ilbay

Mar 13 - Mar 19								Week total: 11:45:32			
Thu, Mar 16								Total: 03:30:00			
WPF APP	• WPL 2 website			\$		09:40 - 12:30		02:50:00			
standup	• WPL 2 website			\$		08:35 - 09:15		00:40:00			
Wed, Mar 15								Total: 08:15:32			
Learning about Web.api	• WPL 2 website			\$		14:58 - 17:03		02:04:34			
sprint review	• WPL 2 website			\$		11:56 - 14:45		02:48:28			
2 learning fetchapi	• WPL 2 website			\$		09:29 - 14:58		02:40:16			
standup	• WPL 2 website			\$		08:46 - 09:28		00:42:14			

Last week								Week total: 08:45:24			
Wed, Mar 22								Total: 08:45:24			
Fetch	• WPL 2 website			\$		16:11 - 17:16		01:05:02			
API	• WPL 2 website			\$		12:23 - 16:11		03:48:28			
WPF APP	• WPL 2 website			\$		10:24 - 12:23		01:58:54			
standup	• WPL 2 website			\$		09:39 - 10:23		00:44:00			
Sprint 1 revision	• WPL 2 website			\$		08:30 - 09:39		01:09:00			

Tacettin Kumas

What are you working on? Project START

Mar 13 - Mar 19 Week total: 11:57:27

Date	Activity	Project	Start Time	End Time	Duration
Thu, Mar 16	inlog pagina	WPL 2 website	Sprint2	\$	09:00 - 12:11
	daily stand up	stands up	Sprint1	\$	08:40 - 08:55
Wed, Mar 15	inlog pagina	WPL 2 website	Sprint2	\$	10:00 - 17:30
	presentatie voorbereiden	WPL 2 website		\$	09:12 - 10:00
	daily stand up	stands up	Sprint1	\$	08:41 - 08:55

Mar 6 - Mar 12 Week total: 02:32:33

What are you working on? Project START

Last week Week total: 11:15:26

Date	Activity	Project	Start Time	End Time	Duration
Thu, Mar 23	website	WPL 2 website	Sprint2	\$	09:00 - 12:15
	daily stand up	stands up	Sprint2	\$	08:40 - 08:50
Wed, Mar 22	website	WPL 2 website	Sprint2	\$	10:00 - 17:00
	daily stand up(probleem oplossend gesprek)	stands up	Sprint2	\$	08:40 - 09:31

Mar 13 - Mar 19 Week total: 11:15:26

Thu, Mar 16 Week total: 03:26:00

The screenshot shows the Clockify application interface. The left sidebar contains navigation links: TIMESHEET (selected), TIME TRACKER, CALENDAR, ANALYZE, DASHBOARD, REPORTS, MANAGE, PROJECTS, TEAM, CLIENTS, TAGS, SETTINGS, and SHOW MORE. The main area displays time entries for the week of March 30. A search bar at the top asks "What are you working on?" with a "Project" button and a "START" button. The total for the week is 11:20:10.

This week

Thu, Mar 30

Category	Description	Tags	Spent	Total
logboek	• logboek	Sprint2	\$ 11:00 - 12:30	01:30:00
website	• WPL 2 website	Sprint2	\$ 08:40 - 11:00	02:20:00

Week total: 11:20:10

Wed, Mar 29

Category	Description	Tags	Spent	Total
logboek	• logboek	Sprint1, Sprint2	\$ 16:42 - 16:58	00:16:01
website	• WPL 2 website	Sprint2	\$ 09:00 - 16:41	07:04:09
standup	• stands up	Sprint2	\$ 08:45 - 08:55	00:10:00

Week total: 07:30:10

Last week

Week total: 11:20:10

Daily scrums

Scrum woensdag 15/03/2023 8u40

Emma Jammaers

Vorige week linkte ik de over-ons pagina aan de navbar en bepaalde ik het aanbod

Vandaag wil ik de gebruikersprofielpagina ontwerpen en bouwen en er meer over leren

Ik verwacht mogelijke problemen bij linken aan database, als ik daar vandaag mee kan beginnen

Emre Ilbay

Vorige week heb ik gewerkt om de navbar en footer mobile compatible te maken. Daarboven heb ik zitten werken aan de WPF app voor de admins. Er kan ingelogd worden en alle tabellen kunnen bekijken worden. Vanaf vandaag ga ik me verdiepen in de FETCH.api. De team heeft hier geen ervaring mee inclusief ik. Dit gaat een leerrijke sprint worden.

Tacettin Kumas

Vorige week heb ik de logboek afgewerkt en gewerkt aan de front-end.

Vandaag gaan we ons verdiepen in de FETCH api als team.

Ik verwacht wel problemen door gebrek aan kennis.

Fatma Kaya

Vorige week heb ik ontworpen en opgebouwd een ontdek-pagina voor de website volgens de huisstijl en ga ik mijn logboek aanvullen.

Vandaag zal ik informatie onderzoeken over Data creëren en Database connection.

Scrum donderdag 16/03/2023 8u40

Emma Jammaers

Gisteren heb ik de profielpagina ontworpen en gebouwd, en heb ik al wat over web APIs, fetch API opgezocht en proberen te begrijpen

Vandaag wil ik mij volledig verdiepen in fetch API, API endpoints en werken met Postman

Ik verwacht hier wat problemen mee aangezien ik hier niet veel van snap

Fatma Kaya

Gisteren heb ik onderzoek gedaan naar de database. Ik probeerde onderwerpen van gegevenstoegang en -verwerking te ontwikkelen.

Vandaag ga ik register pagina aanpassen.

Tacettin Kumas

Gisteren hebben we veel geleert over fetch api.

Vandaag gaan we het proberen toe te passen.

Ik verwacht kleine problemen.

Scrum woensdag 22/03/2023 8u45

Emma Jammaers

Vorige week heb ik mij verdiept in fetch API en heb ik de technische set-up vervolledigd. Vandaag verbeter ik de webpagina's die ik al gemaakt had en ga ik verder met fetch API. Ik verwacht dat de updates niet simpel zullen zijn en dat de fetch API mij problemen kan geven.

Fatma Kaya

Vorige week heb ik aan de webpagina om de webpagina's te verbeteren. Ik heb ontdek pagina opnieuw aanpassen, "href" toevoegen aan de "annuleren" button. Vandaag ga ik Css file van de "aanvraag verzenden" button aanpassen.

Tacettin Kumars

Vorig week heb ik fatch api toegepast in een script. Vandaag ga ik het verwerken door samen te werken met backend. Ik verwacht wel problemen door gebrek aan kennis.

Scrum donderdag 23/03/2023 8u40

Emma Jammaers (10u10)

Gisteren ben ik begonnen met de webpagina's te verbeteren. Vandaag ga ik daarmee verder. Ik verwacht daar geen problemen mee.

Fatma Kaya

Vandaag ik kan niet naar de les vanwege spontane bus staking. Maar ik werk thuis. Gisteren heb ik CSS file van de "aanvraag verzenden" button aanpassen. Wachtwoord pagina opnieuw opgebouwd en mobiel te ontworpen. Vandaag ga ik proberen de taken te voltooien die moeten worden vervuld voor sprint 1.

Tacettin Kumars

Gisteren heb ik gewerkt samen met backend. Vandaag ga ik proberen een connectie te maken met het data. Ik verwacht geen problemen.

Scrum woensdag 29/03/2023 8u45

Emma Jammaers

Vorige week heb ik mijn eigen webpagina's verbeterd. Vandaag voer ik extra controle uit op de webpagina's en verdiep ik mij in de back-end. Ik verwacht problemen omdat de back-end mijn sterkste punt niet is.

Fatma Kaya

Vorige week heb ik de webpagina's die ik heb gemaakt bijgewerkt. Ik zal vandaag de resterende taken controleren en proberen een script te schrijven over een nieuw wachtwoordverzoek met fetch api. Ik weet hier niet veel van. Dus ga ik proberen dit te doen door onderzoek te doen.

Tacettin Kumars

Vorig week heb ik een connectie kunnen maken met de date. Vandaag ga ik werken aan de login pagina. Ik verwacht kleine problemen.

Scrum woensdag 30/03/2023 8u45

Fatma Kaya

De taken voltooid die ik moest doen voor sprint 1.

Ik zal een pagina voor het wijzigen van het wachtwoord ontwerpen. En ik zal proberen een script te schrijven dat een wachtwoordwijzigingsverzoek zal verzenden. Ik zal ook werken aan de e-mailbevestiging. Ik weet hier niet veel van. Ik verwacht hier moeilijkheden mee te krijgen.

Emma Jammaers

Afwezig wegens ziekte

Realisaties (Sprint Review)

Website (front-end)

The image contains three screenshots of the Depo DenOschlagh website:

- Homepage:** Shows a large image of a row of modern storage units with dark blue doors. Text on the left reads: "Welkom bij Depo DenOschlagh! Wilt u graag een garage huren om uw spullen in te bewaren? Of wilt u in uw tuin een opslagcontainer laten plaatsen? Door ons groot assortiment aan opslagmogelijkheden vindt u vast wel wat u zoekt. Bekijk nu ons aanbod!" A blue "Ontdek" button is at the bottom.
- Contact page:** Shows a hallway with several large, dark blue and black storage units. To the right, there's a section titled "Contacteer ons" with contact information: "Voor vragen, opmerkingen, enz. kunt u ons gerust contacteren." Below it is the address: "Depo DenOschlagh, Boomstraat 123, 3500 Hasselt, 0468 / 29 59 33, info@denoschlagh.be".
- Keuzehulp (Storage Selection Guide):** Shows a hallway with orange storage units. The title "Keuzehulp" is at the top. It lists three points:
 - 1. Hoe lang heb je de opslagruijte nodig?** Text: "Als je iets wil oplaan, of dat nu kleine of grote zaken zijn, heb je de juiste opslagruijte nodig. Weet je niet waar je moet beginnen? Geen probleem! Met de volgende tips kom je er stapsgewijs achter wat de beste opslagkeuze is voor jouw bezittingen."
 - 2. Hoeveel opslagruijte heb je precies nodig?** Text: "Wees er zeker van dat je het goede formaat van opslagruijte huurt. Is deze te klein, dan loop je het risico op beschadiging omdat je goederen in de opslagruijte zult moeten proppen. Bij een te grote ruimte verspil je dan weer teveel ruimte en geld. Laat je bijstaan door een professioneel bedrijf; zij zullen je het best kunnen adviseren."
 - 3. Wat is het doel van de opslag?** Text: "Je zult een ander type opslagruijte nodig hebben wanneer je verhuist dan wanneer je wat extra opslagruijte nodig hebt. Vaak is er nood aan een tijdelijke opslagruijte tijdens een verhuis. Indien je niet verhuist en gewoon wat extra tijdelijke ruimte nodig hebt, dan zoek je best naar een opslagplaats in de buurt van je huidige woonst."

Over ons

Wie zijn wij?

Depo DenOpschlagh is opgestart door een groep vrienden met een passie voor ondernemen. Voor onze spullen vonden we geen geschikte opslagruimte dicht bij huis en besloten we om er dan maar zelf één op te zetten, met geweldige resultaat.


Na vijftien jaar zijn wij uitgegroeid tot één van de meest betrouwbare, geliefde en klantvriendelijke verhuurders van opslagruimtes in Limburg en omstreken.

Wij behandelen u niet alleen als klant, maar zeker ook als vriend – wat dus wil zeggen dat wij met de grootste zorgen met uw goederen omgaan. Als u met een glimlach uw spullen achterlaat, zijn wij tevreden!

Onze missie

Bij Depo DenOpschlagh voorzien we je steeds van de meest geschikte opslagruimte. Je kan jouw materiaal veilig bij ons laten bewaren in goed geventileerde, verwarmde, vocht- en vorstvrije ruimtes. Onze opslagruimtes zijn bovendien voorzien van strikte beveiliging; niemand kan aan jouw spullen komen.

Wij voorzien u van gunstig gelegen locaties voor uw opslagnoden, alsook een heel gamma aan verschillende soorten opslagruimtes en contracten, waardoor er geheid één tussen zit die perfect voor u en uw situatie past.

Depo
DenOpschlagh

0468 / 29 59 33
info@denopschlagh.be

ONZE AANBOD

Geen idee hoeveel opslagruimte je nodig hebt? Bekijk ons aanbod.

Opslagruimte type 1m² | Oppervlakte: 1m² | Inhoud: 3m³ Formaat: 1,20x1,20x2,40m (LxBxH) | Prijs: €28 per maand

Opslagruimte type 3m² | Oppervlakte: 3m² | Inhoud: 8m³ Formaat: 2,30x1,50x2,40m (LxBxH) | Prijs: €55 per maand






Depo
DenOpschlagh

Nieuwe Wachtwoord

Wachtwoord:

Herhaal wachtwoord:


Registreren

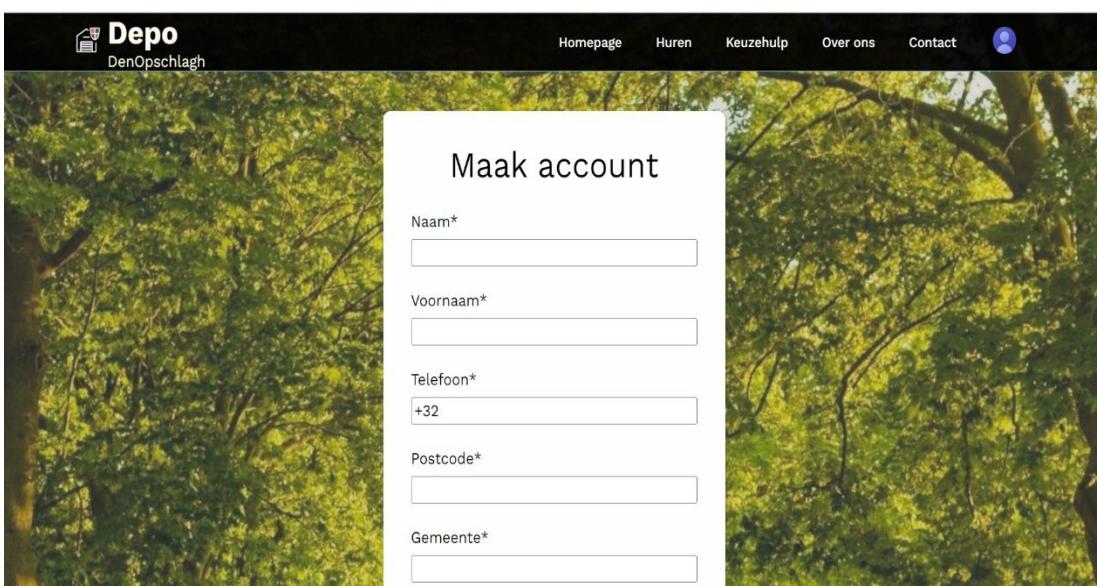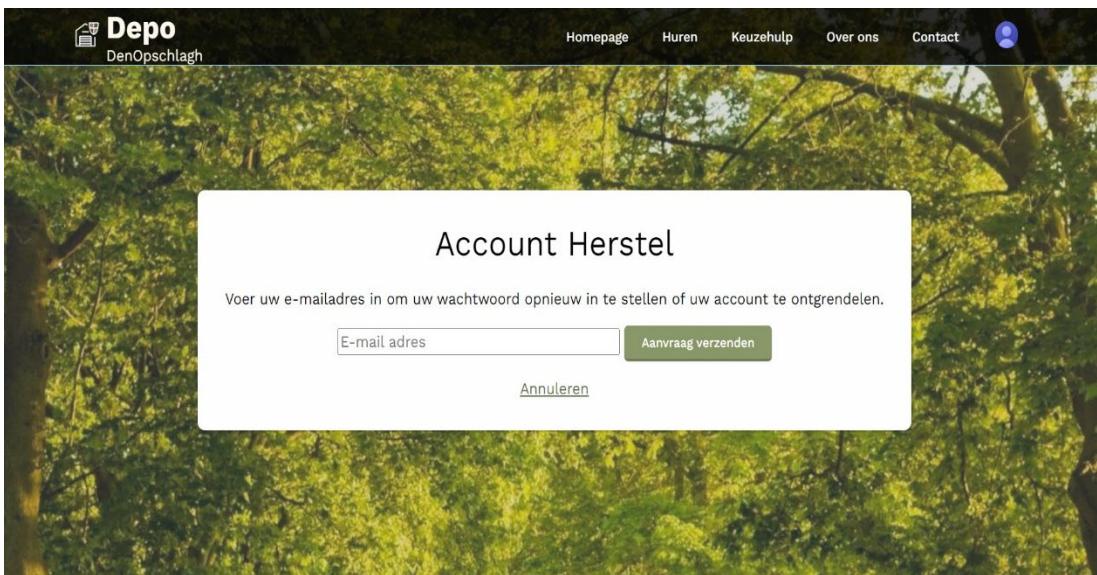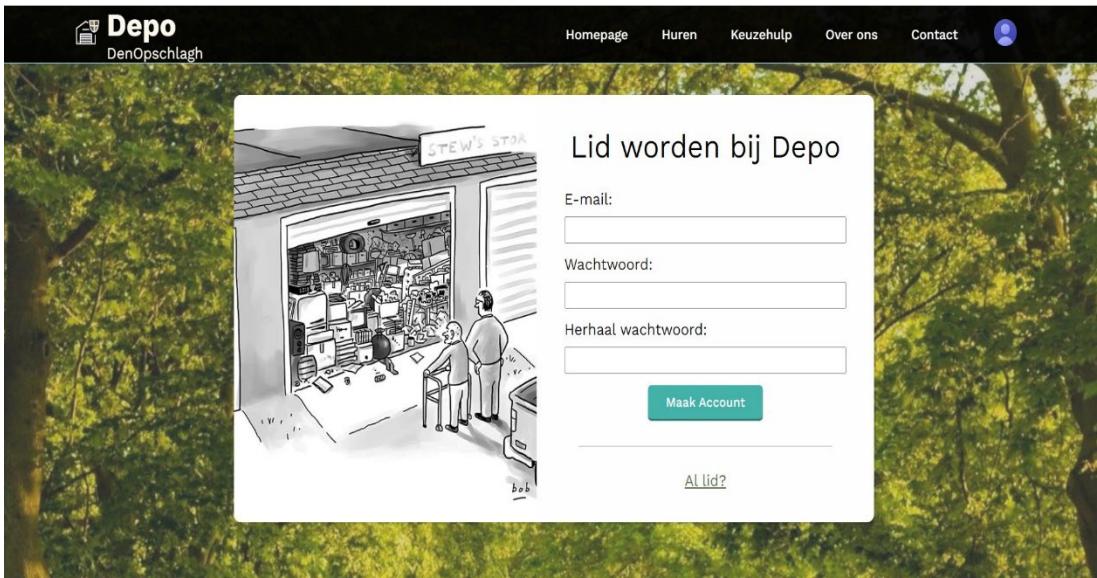

Wireframe

Class Library (optioneel)

Database

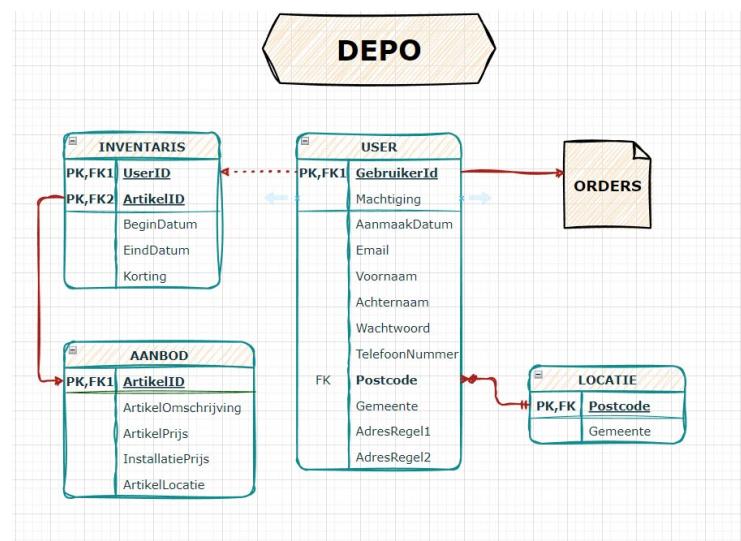

Leerpunten (Sprint Retrospective)

Op het EINDE VAN DE SPRINT bespreek je de leerpunten:

- **Wat ging goed?**

De takenverdeling en communicatie.

- **Wat ging minder goed en waarom?**

Betere samenwerking

- **Wat wil je verbeteren in volgende sprint?**

De samenwerking

Enkele specifieke punten die je ook bespreekt:

- **Hoe verliep het technisch werk?**

Slecht, we staan achter wegens de backend

- **Welke opdrachten gingen goed?**

Maken van een gebruiker en gegevens opnemen

- **Over welke realisaties ben je tevreden?**

Hebben van een login en registratie pagina

- **Welke opdrachten verliepen moeilijk en waarom?**

Fetch api, was een zoekwerk

- **Welke technische kennis kom je tekort en wat ga je daaraan doen?**

Fetch api, samenwerking

- **Zou je het anders of efficiënter aan kunnen pakken? Zo ja, hoe?**

Vragen voor hulp aan lectoren

- **Zeer belangrijk: welk zijn hieruit je actiepunten voor volgende sprint**

Thuis voorbereiden

Hoe verliepen daily stand ups?

- **Wat ging er goed in de samenkomst?**

Iedereen weet wat die moet doen.

- **Wat ging er moeilijk?**

Het alleen maar vertellen van wat we hebben gedaan en wat we gaan doen.

- **Wat willen jullie behouden en wat anders doen?**

Meer uitleg over taken over hoe het gaat en vragen indien er hulp nodig zal zijn.

Hoe verliep het invullen van de rol van scrum master? (enkel in te vullen door de scrum master)

- **Wie was scrum master?**

Tacettin Kumaz

- **Hoe heb je dit ervaren? Wat ging goed? Wat ging minder goed?**

Goed, je moet soms wat meer duidelijker zijn. De communicatie ging goed onderling. De samenwerking als team moet nog op gewerkt worden.

- **Hoe hebben de anderen jou ervaren als scrum master? (vraag feedback)**

Tevreden

- **Ligt dit jou of minder? Geef uitleg bij je mening.**

Ik heb niet meer verwacht.

- **Welke tip geef je mee aan de volgende scrum master?**

Wees duidelijk en probeer alles onder controle te houden.

Hoe verliep de samenwerking in je groep?

- **Is jullie groep al een team?**
 - **Waarom wel/waarom niet?**
Beter dan de vorige sprint
 - **Wat is er nog nodig volgens jou?**
Samenwerking
- **Hoe verliep de communicatie onderling?**
Voldoende, we begrepen mekaar.
- **Hebben jullie mekaar geholpen of heb je hulp ondervonden? Welke hulp is er gegeven?**
We hebben mekaar wel geholpen met hoe we een taak moeten gaan aanpakken, maar voor in de code niet verse. De backend team heeft wel samengewerkt.

Feedback

Team

Tijdens ons sprint review kregen we als feedback om taken te verdelen en een samenwerking te stichten in het team. We hebben veel hulp gekregen van de lectoren wegens de samenwerking die er niet was in ons team. We zullen dus nu als team goed samenwerken.

Individueel

Tacettin Kumas

We hebben vooral feedback gekregen over hoe we als team met elkaar samen kunnen werken.

Fatma Kaya

In Sprint 2 werden de taken opgesplitst. Ik werkte als front-end. De onderwerpen die ontwikkeld of herschikt moesten worden binnen de taken uit sprint 1 werden als taak overgezet naar sprint 2. Om deze reden had ik niet genoeg tijd over voor de dingen die ik in Sprint 2 moest doen. Daarnaast had ik een zeer hoog motivatieverlies door een aantal vervelende situaties in het team. Ik kon me niet concentreren op wat ik moest doen en durfde de nieuwe taken niet te doen. Ik deelde deze situatie en mijn gevoelens met het team. Ik probeerde door te gaan met het team, hoewel het erg moeilijk voor me was en probeerde de taken van Sprint 2 uit te voeren. We hebben constructieve feedback gekregen om binnen dit kader als een team te werken.

Emma Jammaers

De feedback die we kregen, had vooral te maken met de samenwerking als team. Deze was zeer waardevol en heb ik proberen om te zetten tot acties tijdens de sessies, met variërend succes. Met deze feedback zal ik in de toekomst ook verder werken.

SPRINT 3

Backlog

Issue ID	Taak	Beschrijving sprint Item (taak)
01	01	Bewerken van besteloverzicht
02	01	Bestel overzicht
03	01	Winkelmand
04	01	Individuele opdracht
05	01	User login – Aangemeld blijven
	02	Session start
	03	Gebruikers-ID en naam kunnen worden opgeroepen
	04	WebApi POST-endpoint schrijven
	05	Gebruiker naam kunnen weergeven op het scherm
	06	Na de loginstarten schijnt afmelden button
06	01	User login - Bevestiging gewijzigde wachtwoord
	02	Fetch Api- informatie onderzoek over NodeMailerLibrary
	03	WebApi POST-endpoint schrijven(Bevestiging email)
07	01	User login - Wachtwoord wijzigen
	02	Over Fetch Api onderzoek doen
	03	Fetch Api POST schrijven(wachtwoord wijzigen)
	04	webApi POST-endpoint schrijven(wachtwoord wijzigen)
08	01	User login - Profielgegevens raadplegen
	02	WebApi POST-endpoint schrijven(gegevens raadplegen)
	03	FetchApi POST schrijven(gegevens raadplegen)
	04	Profielpagina i.p.v inlogpagina tijdens inloggen
09	01	User login - Rechten/Machtigingen
	02	Rechten en machtigingen verwezen

Taakverdeling & planning

Issue ID	Taak	Member(s)	Geschatte tijd (u)
01	01	Tacettin Kumas	
02	01	Tacettin Kumas	
03	01	Tacettin Kumas	
04	01	Fatma Kaya	6u
05	01	Fatma Kaya	2u
	02	Fatma Kaya	1u
	03	Fatma Kaya	2u
	04	Fatma Kaya	2u
	05	Fatma Kaya	1u
	06	Fatma Kaya	1u
06	01	Fatma Kaya	2u
	02	Fatma Kaya	2u
	03	Fatma Kaya	2u
07	01	Fatma Kaya	2u
	02	Fatma Kaya	2u
	03	Fatma Kaya	2u
	04	Fatma Kaya	1u
08	01	Fatma Kaya	2u
	02	Fatma Kaya	2u
	03	Fatma Kaya	1u
	04	Fatma Kaya	1u
09	01	Fatma Kaya	2u
	02	Fatma Kaya	2u
10	01	Fatma Kaya	1u
	02	Fatma Kaya	1u

Scrum Bord

<p>85 Individuele opdracht sprint 2 FK Fatma Kaya State Done</p>		<p>96 Individuele opdracht FK Fatma Kaya State Done</p>
<p>84 User login - Aangemeld blijven FK Fatma Kaya State To Do</p>		<p>137 session start FK Fatma Kaya State Done</p>
		<p>159 Gebruikers-ID en naam kunnen worden opgeroepen FK Fatma Kaya State Done</p>
		<p>161 webApi POST-endpoint schrijven FK Fatma Kaya State Done</p>
		<p>168 Gebruiker naam kunnen weergeven op het scherm FK Fatma Kaya State Done</p>
	<p>+</p>	<p>169 Na de loginstarten schijnt afmelden button FK Fatma Kaya State Done</p>
<p>83 User login - Bevestiging gewijzigde wachtwoord FK Fatma Kaya State To Do</p>		<p>138 Fetch Api- informatie onderzoek over NodeMailerLibrary FK Fatma Kaya State Doing</p>
	<p>+</p>	<p>139 webApi POST-endpoint schrijven(bevestiging email) FK Fatma Kaya State Doing</p>

<p><input checked="" type="checkbox"/> 82 User login - Wachtwoord wijzigen</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● To Do</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 158 webApi POST-endpoint schrijven(wachtwoord)</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● To Do</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 104 Over Fetch Api onderzoek doen</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Doing</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 157 Fetch Api POST schrijven(wachtwoord wijzigen)</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 80 User login - Profielgegevens raadplegen</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Doing</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> 164 FetchApi POST schrijven(gegevens raadplegen)</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Doing</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 163 webApi POST-endpoint schrijven(gegevens raadplegen)</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 79 User login - Rechten/Machtigingen</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● To Do</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 135 rechten en machtigingen verwezen</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● To Do</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> 165 Profielpagina i.p.v inlogpagina tijdens inloggen</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 78 User login - Afmelden</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● To Do</p>			<p><input checked="" type="checkbox"/> 136 session end</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
			<p><input checked="" type="checkbox"/> 170 bij het klikken afmelden button werden gegevens bij de storage gewist</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
			<p><input checked="" type="checkbox"/> 171 Afmelden button zichtbaar worden</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 77 User login - Aanmelden</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>			<p><input checked="" type="checkbox"/> 132 de fetch posten</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
			<p><input checked="" type="checkbox"/> 133 een session krijgen om ingelogd te blijven</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● Done</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 76 User Login - Registreren</p> <p>FK Fatma Kaya</p> <p>State ● To Do</p>			

<input checked="" type="checkbox"/> 145 producten kunnen filteren. Emre Ibay State: To Do			<input checked="" type="checkbox"/> 156 Producten kunnen gerangschikt worden op basis van Type-Locatie (en/of grootte). Emre Ibay State: Done
<input checked="" type="checkbox"/> 144 gedetailleerde info. Emre Ibay State: To Do		<input checked="" type="checkbox"/> 166 Gedetailleerde product pagina creeren. Emre Ibay State: Doing	
<input checked="" type="checkbox"/> 143 beschikbare dagen van product. Emre Ibay State: To Do		<input checked="" type="checkbox"/> 167 Beschikbaarheid van producten uit de Huurperiode tabel. Emre Ibay State: Doing	
<input checked="" type="checkbox"/> 142 product card. Emre Ibay State: To Do			<input checked="" type="checkbox"/> 168 Locaties en beschikbare groottes afhalen op basis van type. Emre Ibay State: Done
<input checked="" type="checkbox"/> 141 beschikbare producten. Emre Ibay State: To Do		<input checked="" type="checkbox"/> 154 Producten toevoegen aan de database. Emre Ibay State: Doing	<input checked="" type="checkbox"/> 155 Een HttpGet voor het krijgen vd prod. Emre Ibay State: Done
			<input checked="" type="checkbox"/> 162 Producten dynamisch genereren en weergeven. Emre Ibay State: Done

PXL2023PlanningToolTeam05 Team | New Work Item | Column Options | Sprint 3 | Person: All | Filter | Settings

Collapse all	To Do	Doing	Done
<input checked="" type="checkbox"/> 153 bewerken van besteloverzicht. TK Tacettin Kumas State: To Do	<input checked="" type="checkbox"/> 176 rechten geven aan klant. TK Tacettin Kumas State: To Do		
<input checked="" type="checkbox"/> 152 bestel overzicht. TK Tacettin Kumas State: To Do			<input checked="" type="checkbox"/> 172 besteloverzicht maken. TK Tacettin Kumas State: Done
<input checked="" type="checkbox"/> 151 winkelmand. TK Tacettin Kumas State: To Do		<input checked="" type="checkbox"/> 173 winkelmand pagina maken. TK Tacettin Kumas State: Doing	
<input checked="" type="checkbox"/> 150 aanpassen van producten. TK Tacettin Kumas State: To Do	<input checked="" type="checkbox"/> 174 verhuurder aanmaken. TK Tacettin Kumas State: To Do		

Timesheets

Fatma Türkan Kaya

04/05/2023

This week

Week total: 09:52:04

Yesterday							Total: 03:24:00	
aan de gebruikergegevens raadplegen en het be...	● WPL 2 web...		\$	11:15 - 12:30		01:15:00		
logboek aanpassen voor sprint3	● WPL 2 website		\$	09:21 - 11:15		01:54:00		
Daily Standup	● WPL 2 website		\$	08:45 - 09:00		00:15:00		

03/05/2023

Wed, May 3							Total: 06:28:04	
Usergegevens weergeven op profielpagina	● WPL 2 website		\$	15:43 - 17:25		01:41:53		
Individuele opdracht	● WPL 2 Individuele opdracht		\$	13:42 - 15:33		01:50:11		
Gebruikers-ID en naam kunnen worden opgeroep...	● WPL 2 web...		\$	09:30 - 12:11		02:41:00		

27/04/2023

Last week							Week total: 09:48:00	
Thu, Apr 27							Total: 03:05:00	
Tussen log-in fetchapi en web api connectie ma...	● WPL 2 webs...		\$	09:15 - 12:00		02:45:00		

26/04/2023

Wed, Apr 26							Total: 06:43:00	
Individuele opdracht- .Net (GET) WebApi sc...	● WPL 2 Individuel...		\$	15:00 - 17:11		02:11:00		
WebApi endpoint informatie onderzoeken	● WPL 2 website		\$	13:40 - 14:40		01:00:00		
Over .Net Web Api Informatie nemen	● WPL 2 website		\$	09:10 - 12:22		03:12:00		

20/04/2023

Apr 17 - Apr 23							Week total: 05:10:29	
Thu, Apr 20							Total: 02:40:41	
Individuele opdracht-Data Tabel ma...	● WPL 2 Individuele opdra...		\$	11:49 - 12:25		00:35:40		
Fetch Api- informatie onderzoeken over NodeMa...	● WPL 2 web...		\$	09:45 - 11:33		01:48:28		

19/04/2023

Wed, Apr 19		Total: 02:29:48					
Een Fetch Api schrijven om een bevestigingsmai...	• WPL 2 web...	\$	09:15 - 11:28	02:13:00			
Daily Standup	• WPL 2 website	\$	08:46 - 09:03	00:16:48			

Emre Ilbay

Last week		Week total: 08:38:33					
Thu, Apr 27							Total: 03:41:39
Product Pagina	• WPL 2 website	\$	08:52 - 12:26	03:33:48			
standup	• WPL 2 website	\$	08:44 - 08:52	00:07:51			
Wed, Apr 26						Total: 04:56:54	
Database in SSMS	• WPL 2 website	\$	13:00 - 17:30	04:30:00			
standup	• WPL 2 website	\$	08:45 - 09:12	00:26:54			

This week		Week total: 12:00:00					
Thu, May 4							Total: 04:00:00
product availability	• WPL 2 website	\$	09:00 - 12:30	03:30:00			
standup	• WPL 2 website	\$	08:30 - 09:00	00:30:00			
Wed, May 3						Total: 08:00:00	
Product Pagina	• WPL 2 website	\$	09:30 - 17:15	07:45:00			
standup	• WPL 2 website	\$	09:00 - 09:15	00:15:00			

Tacettin Kumas

Apr 17 - Apr 23		Week total: 11:41:56					
Thu, Apr 20							Total: 03:50:00
data	• WPL 2 website	Sprint2	\$	11:00 - 12:30	01:30:00		
website	• WPL 2 website	Sprint2	\$	08:40 - 11:00	02:20:00		
Wed, Apr 19						Total: 07:51:56	
website	• WPL 2 website	Sprint2	\$	09:00 - 16:41	07:41:56		
standup	• stands up	Sprint2	\$	08:45 - 08:55	00:10:00		

Last week		Week total: 09:00:00					
Thu, Apr 27		Total: 03:00:00					
individueel opd	• WPL 2 Individuele opdracht		\$	09:00 - 12:00		03:00:00	
Wed, Apr 26		Total: 06:00:00					
website	• WPL 2 website	Sprint2	\$	14:00 - 17:00		03:00:00	
individueel opd	• WPL 2 Individuele opdracht		\$	09:00 - 12:00		03:00:00	

Scrum woensdag 19/04/2023 8u40

Emre Ilbay

Tacettin Kumas

Fatma Kaya

Vorige week zijn de taken voltooid die ik moest doen voor sprint 1.

Ik heb een pagina voor het wijzigen van het wachtwoord ontwerpen. En ik probeerde een script te schrijven

dat een wachtwoordwijzigingsverzoek zal verzenden. Ik heb ook gewerkt aan de e-mailbevestiging.

Vandaag moeten wij sprint2 presenteren. Ik zal Een Fetch Api schrijven om een bevestigingsmail te sturen.

Ik weet hier niet veel van. Ik verwacht hier moeilijkheden mee te krijgen.

Scrum woensdag 20/04/2023 8u40

Emre Ilbay

Heb een lastige periode achter de rug gehad en heb niet zo heel veel gedaan.

Ik ben thuis bezig geweest met een API te schrijven voor oefen redenen.

Tacettin Kumas

Fatma Kaya

Gisteren heb ik een Fetch Api schrijven om een bevestigingsmail te sturen. Normaal gezien werkt het. Maar moet ik nog iets aanpassen om de data uit sql server vlot te bewerken. Vandaag ga ik Fetch Api- informatie onderzoeken over NodeMailerLibrary. Ik werk aan een individueel project. Ik weet hier niet veel van. Dus ga ik proberen dit te doen door onderzoek te doen.

Scrum woensdag 26/04/2023 8u40

Emre Ilbay

Heb een paar producten aan de database toegevoegd en ben bezig geweest met het maken van de product catalogus. Dit houdt in: Database, API en de fetch/design.

Fatma Kaya

Gisteren heb ik gewerkt om bevestigingsmail te sturen.

Vandaag ga ik onderzoek doen over .Net Web Api en endpoint informatie. Ik werk aan Individuele opdracht (.Net (GET) WebApi schrijven en Data oproepen). Ik verwacht problemen omdat de back-end mijn sterkste punt niet is.

Tacettin Kumas

Scrum donderdag 27/04/2023 8u40

Emre Ilbay

Verder bezig geweest met maken van de product catalogus.

Fatma Kaya

Gisteren heb ik een fetch api schreven over bevestigingsmail. De benodigde gegevens voor het inloggen van de gebruiker worden bewaard in de lokale opslag. Andere pagina's kunnen worden bekeken als gebruikerslogin. Ik ga werken aan de verbinding tussen de login fetch api en de web api.

Tacettin Kumas

Scrum donderdag 03/05/2023 8u40

Emre Ilbay

Product catalogus afgerond. Ben over geschakeld naar de details pagina (voor wanneer er op een product word geklikt.)

Fatma Kaya

De gebruiker kan inloggen met het e-mailadres en wachtwoord van de gebruiker. Gebruikers-ID en naam kunnen worden opgeroepen vanuit de databank met een fetch api-query. Als de gebruiker niet is ingelogd, zegt de navigatiebalk ook gast. Als de gebruiker is ingelogd, wordt de naam van de persoon geschreven. Vandaag ga ik werken aan de structuur van de inlogpagina. Nadat de gebruiker is ingelogd, zal de pagina zeggen dat hij is ingelogd. Ik zal ook werken aan de pagina met uitlogprocessen voor gebruikers en persoonlijke informatie.

Tacettin Kumas

Scrum donderdag 04/05/2023 8u40

Emre Ilbay

Heb wat aanpassingen gebracht aan hoe de api werkt en welke data dat het terug verzend. Had eerst een tabel met de capaciteiten per locatie en nog een tabel om bij te houden hoeveel er beschikbaar waren per locatie. Echter bij het maken van de details pagina merkte ik op dat er een *eerst volgende beschikbaarheid datum* vermeld moest staan. Heb dan aanpassingen gebracht aan de database en een tabel toegevoegd waarin vermeld word wie wat van wanneer tot wanneer heeft gehuurd. Had hier eerst niet aan gedacht omdat ik dacht dat dit meer deel uitmaakte van de orders categorie en niet de producten. Maar het ziet er naar uit dat er zich niet veel opties presenteren. Het uitzoeken van hoe ik dingen zou kunnen implementeren en het dan achteraf constant moeten aanpassen pakt veel tijd in.

Fatma Kaya

Gebruikerslogin is mogelijk. De gebruikersnaam staat in de navigatiebalk. Anders schrijft de Guest. Mobiele compatibiliteit is voltooid. Wanneer op de inlogpagina wordt geklikt nadat de gebruiker is ingelogd, wordt de gebruiker naar de profielpagina geleid. Voor sprint 3 zal ik vandaag het logboek bewerken. Ik zal werken aan het raadplegen van gebruiker gegevens en ook aan het beëindigen van sessies.

Tacettin Kumas

Realisaties (Sprint Review)

Website (front-end)

The screenshot shows the homepage of the Depo DenOpschlagh website. At the top, there is a navigation bar with links to 'Homepage', 'Huren', 'Keuzehulp', 'Over ons', 'Contact', and a user icon labeled 'Guest'. The main content area features a large image of a modern building with several dark grey garage doors. To the left of the image, the text 'Welkom bij Depo DenOpschlagh!' is displayed, followed by a paragraph about renting garages or storage containers. A green 'Ontdek' button is located at the bottom left of the content area.

This screenshot shows the same website as above, but with a user profile 'Fatma' logged in. The navigation bar now includes 'Fatma' and 'Afmelden'. The content area remains the same, featuring the welcome message and the image of the garage units.

This screenshot shows the user profile page for 'Fatma'. On the left, there is a sidebar with a 'Contracten' section stating 'U heeft geen contracten.' On the right, a 'Profiel' card displays basic information: 'Naam: Fatma', 'Voornaam: Kaya', and 'E-mailadres: fatma.kaya2@student.pxl.be'. A green 'Gegevens aanpassen' button is at the bottom of the card.

Huren bij Depo!

Uw spullen verdienen alle zorg en veiligheid dat ze verdienen. Onze garage's zijn beveiligd en verzekerd!

Kies een garage op basis van uw behoeftes.

Type box: Garage Plaats: 3500 - Hasselt Beschikbare maten: 12m², 18m², 24m², 36m²

Zoeken I'm feeling lucky

Hasselt
Haswegstraat 2, 3500 Hasselt €245,- p/m

Hasselt
Hakunastraat 34, 3500 Hasselt €605,- p/m

Beschikbare maten:


Maten:

Garagepark in Hasselt

Omschrijving:
Wij zijn cool ok!!

Wireframe

Class Library (optioneel)

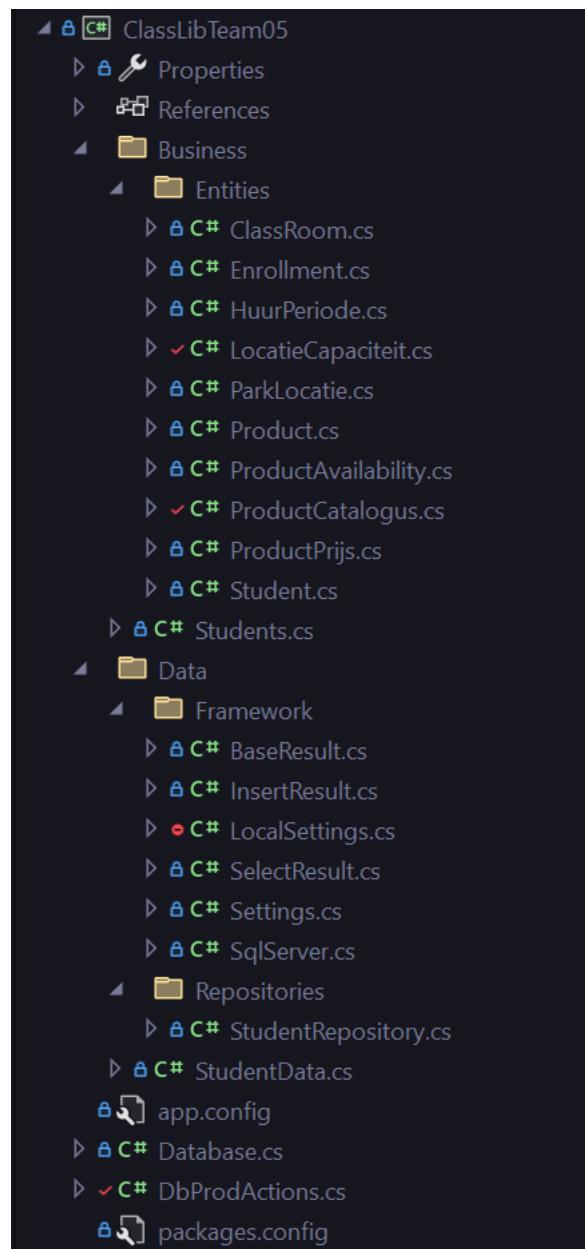

Database

- + dbo.Gebruikers
- + dbo.GpLocatie
- + dbo.HuurPeriode
- + dbo.LocatieCapaciteit
- + dbo.LocatieOverzicht
- + dbo.Locaties
- + dbo.Prijzen
- + dbo.Producten
- + dbo.ProductImage

Leerpunten (Sprint Retrospective)

Leerpunten (Sprint Retrospective)

Op het EINDE VAN DE SPRINT bespreek je de leerpunten:

- **Wat ging goed?**

De takenverdeling en communicatie.

- **Wat ging minder goed en waarom?**

Omdat het kader van de taken nauwkeurig was opgesteld, was er geen storing bij afwezigheid van teamleden. omdat elk teamlid zijn eigen studieschema volgde en zijn grenzen stelde.

- **Wat wil je verbeteren in volgende sprint?**

Om de werktijd efficiënter te maken, kan naar verschillende oplossingen worden gezocht. De hele tijd zoeken naar een oplossing voor hetzelfde probleem kan soms frustrerend zijn.

Enkele specifieke punten die je ook bespreekt:

- **Hoe verliep het technisch werk?**
- **Welke opdrachten gingen goed?**

Gebruikerslogin is mogelijk. Gebruikers gegevens kunnen worden opgeroepen vanuit de databank met een fetch api-query.

- **Over welke realisaties ben je tevreden?**
- De gebruikersnaam staat in de navigatiebalk. Anders schrijft de Guest. Mobiele compatibiliteit is voltooid. Wanneer op de inlogpagina wordt geklikt nadat de gebruiker is ingelogd, wordt de gebruiker naar de profielpagina geleid.
- **Welke opdrachten verliepen moeilijk en waarom?**

Fetch api den web api was een zoekwerk

- **Welke technische kennis kom je tekort en wat ga je daaraan doen?**
Fetch api en web api end point schreven
- **Zou je het anders of efficiënter aan kunnen pakken? Zo ja, hoe?**
Vragen voor hulp aan lectoren
- **Zeer belangrijk: welk zijn hieruit je actiepunten voor volgende sprint**
Thuis voorbereiden

Hoe verliepen daily stand ups?

- **Wat ging er goed in de samenkomst?**
Iedereen weet wat die moet doen.
- **Wat ging er moeilijk?**
Het alleen maar vertellen van wat we hebben gedaan en wat we gaan doen.

Omdat onze taken gescheiden van elkaar zijn, is het aantal taken dat we samen uitvoeren laag.

- **Wat willen jullie behouden en wat anders doen?**

Meer uitleg over taken over hoe het gaat en vragen indien er hulp nodig zal zijn.

Hoe verliep het invullen van de rol van scrum master? (enkel in te vullen door de scrum master)

- **Wie was scrum master?**

F.Türkan Kaya

- **Hoe heb je dit ervaren? Wat ging goed? Wat ging minder goed?**

Het was een zeer rustige maar productieve sprintperiode. persoonlijk had iedereen het te druk met zijn taken.

- **Hoe hebben de anderen jou ervaren als scrum master? (vraag feedback)**

Tevreden

- **Ligt dit jou of minder? Geef uitleg bij je mening.**

- **Welke tip geef je mee aan de volgende scrum master?**

Door je gemakkelijk aan te passen aan veranderingen die zich binnen het team of individueel kunnen voordoen en effectief te zijn in het bepalen van prioriteiten, kan de teamsamenwerking worden versterkt.

- **Hoe verliep de samenwerking in je groep?**

In deze sprint is het goed.

- **Is jullie groep al een team?**

- **Waarom wel/waarom niet?**

Beter dan de vorige sprint

- **Wat is er nog nodig volgens jou?**

Door de taakverdeling zijn teamleden niet meer zo afhankelijk van elkaar. Er zijn echter nog steeds overlappende punten in de missies en de samenwerking moet worden voortgezet.

- **Hoe verliep de communicatie onderling?**

Voldoende, we begrepen mekaar.

- **Hebben jullie mekaar geholpen of heb je hulp ondervonden? Welke hulp is er gegeven?**

Na de taakverdeling deelden teamleden informatie over de codes die ze eerder hadden geschreven. Zodat ze de geschreven codering beter kunnen begrijpen en vervolgens de taak kunnen uitvoeren.

Feedback

Team

Door de afname van ons aantal werd het voor ons moeilijk om de werken als team te voltooien en daarom werd er een nieuwe taakverdeling gemaakt. Fatma Türkan Kaya doet de UserLogin-taken, Emre İlbay doet de Product-taken en Tacettin Kumas doet de Order-taken. Op de overlappende punten van de taken werd de teamleden echter gevraagd om hulp van elkaar te vragen.

Individueel

Fatma Kaya

De feedback die we kregen, had vooral te maken met de samenwerking als team. Omdat een van zijn teamleden uitviel voor sprint 3, werden de taken opnieuw toegewezen. Door de afname van het aantal teamleden zullen we onze taken kunnen vervullen zonder van elkaar afhankelijk te zijn.

Er werd aangegeven dat we tijdens de les geen vragen stelden aan de coaches en gezegd dat we niet moesten aarzelen om vragen te stellen wanneer we die nodig hadden.

Door mijn persoonlijkheid ben ik niet iemand die makkelijke vragen kan stellen en om hulp kan vragen, ik probeer mijn problemen op te lossen door zelf te werken en te onderzoeken. Natuurlijk wil ik graag hulp bij problemen waar ik niet mee om kan gaan, maar dit is niet altijd een situatie die mij overkomt.

SPRINT 4

Backlog

Issue ID	Taak	Beschrijving sprint Item (taak)
01	153	Bewerken van besteloverzicht
	176	Rechten geven aan klant
	181	Winkelmandje kan aangepast worden
02	151	Winkelmand
	173	Winkelmand pagina maken
	180	Winkelmandje
03	150	Aanpassen van producten
	179	Admins kunnen tabellen in de database aanpassen via WPF
04	149	toevoegen van producten
	178	Admins kunnen producten toevoegen
05	147	Periode aanduiden
	182	Startdatum en duur in maanden
06	146	Producten selecteren
	183	Catalogus met producten
07	144	Gedetailleerde info
	166	Gedetailleerde product pagina creeeren
08	141	Beschikbare producten
	154	Producten toevoegen aan de database
09	83	User login - Bevestiging gewijzigde wachtwoord
	138	Fetch Api- informatie onderzoek over NodeMailerLibrary
	139	WebApi POST-endpoint schrijven(bevestiging email)
10	82	User login - Wachtwoord wijzigen
	104	Over Fetch Api onderzoek doen
	158	WebApi POST-endpoint schrijven(wachtwoord wijzigen)
11	80	User login - Profielgegevens raadplegen

	177	Gebruikersgegevens aanpassen
12	79	Product Contracten raadplegen en email verzenden
	135	Product Contracten raadplegen en email verzenden
13	76	User Login - Registreren
	184	Nieuwe User registreren

Taakverdeling & planning

Issue ID	Taak	Member(s)	Geschatte tijd (u)
01	153	Tacettin, Emre(Issue)	
	176	Tacettin	
	181	Emre	
02	151	Tacettin(Issue)	
	173	Tacettin	
	180	Emre	
03	150	Tacettin(Issue)	
	179	Emre	
04	149	Tacettin(Issue)	
	178	Emre	
05	147	Tacettin(Issue)	
	182	Emre	
06	146	Tacettin(Issue)	
	183	Emre	
07	144	Emre(Issue)	
	166	Emre	
08	141	Emre(Issue)	
	154	Emre	
09	83	Fatma(Issue)	--
	138	Fatma	1u
	139	Fatma	1u
10	82	Fatma(Issue)	--
	104	Fatma	2u
	158	Fatma	2u
11	80	Fatma(Issue)	--
	177	Fatma	2u
12	79	Fatma(Issue)	--

	135	Fatma	4u
13	76	Fatma(Issue)	--
	184	Fatma	3u

Scrum Bord

To Do	Doing	Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 153 bewerken van besteloverzicht TK Tacettin Kumus State: To Do <input checked="" type="checkbox"/> 176 rechten geven aan klant TK Tacettin Kumus State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 181 Winkelmandje kan aangepast worden EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 151 winkelmand TK Tacettin Kumus State: To Do <input checked="" type="checkbox"/> 173 winkelmand pagina maken TK Tacettin Kumus State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 180 Winkelmandje EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 150 aanpassen van producten TK Tacettin Kumus State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 179 Admins kunnen tabellen in de database aanpassen via WPF EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 149 toevoegen van producten TK Tacettin Kumus State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 178 Admins kunnen producten toevoegen EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 147 periode aanduiden TK Tacettin Kumus State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 182 Startdatum en duur in maanden EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 146 producten selecteren TK Tacettin Kumus State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 183 Catalogus met producten EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 144 gedetailleerde info EI Emre Ilbay State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 166 Gedetailleerde product pagina creeren EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 141 beschikbare producten EI Emre Ilbay State: To Do 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 154 Producten toevoegen aan de database EI Emre Ilbay State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 83 User login - Bevestiging gewijzigde wachtwoord FK Fatma Kaya State: Done 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 138 Fetch Api+ informatie onderzoek over NodeMailerLibrary FK Fatma Kaya State: Done <input checked="" type="checkbox"/> 139 webApi POST-endpoint schrijven/bevestiging email FK Fatma Kaya State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 82 User login - Wachtwoord wijzigen FK Fatma Kaya State: Done 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 104 Over Fetch Api onderzoek doen FK Fatma Kaya State: Done <input checked="" type="checkbox"/> 158 webApi POST-endpoint schrijven/wachtwoord FK Fatma Kaya State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 80 User login - Profielgegevens raadplegen FK Fatma Kaya State: Done 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 177 Gebruikersgegevens aanpassen FK Fatma Kaya State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 79 Product Contracten raadplegen en email verzenden FK Fatma Kaya State: Done 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 135 Product Contracten raadplegen en email verzenden FK Fatma Kaya State: Done
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 76 User Login - Registreren FK Fatma Kaya State: Done 		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 184 Nieuwe User registreren FK Fatma Kaya State: Done

Timesheets

Emre İlbay:

May 15 - May 21		Week total: 09:00:00				
Wed, May 17		Total: 09:00:00				
winkelmandje	• WPL 2 website		\$	08:30 - 17:30		09:00:00
May 8 - May 14		Week total: 07:59:01				
Wed, May 10		Total: 07:59:01				
product details	• WPL 2 website		\$	09:10 - 17:00		07:49:01
standup	• WPL 2 website		\$	09:00 - 09:10		00:10:00
Last week		Week total: 13:00:00				
Thu, May 25		Total: 04:00:00				
WPF APP	• WPL2 BackEnd		\$	08:30 - 12:30		04:00:00
Wed, May 24		Total: 09:00:00				
Individueel	• WPL 2 Individuele opdracht		\$	12:30 - 17:30		05:00:00
Orders	• WPL 2 website		\$	08:30 - 12:30		04:00:00

Fatma Türkan Kaya

May 15 - May 21		Week total: 03:23:55				
Wed, May 17		Total: 03:23:55				
Gegevens aanpassen	• WPL 2 website		\$	11:15 - 12:15		01:00:00
Individuele opdracht	• WPL 2 Individuele opdracht		\$	09:03 - 11:03		02:00:00
2 Daily Standup	• WPL 2 website		\$	08:40 - 09:03		00:23:55
May 8 - May 14		Week total: 08:10:33				
Thu, May 11		Total: 02:44:36				
Nieuwe klassen maken om een goede architectuur op de backend te bouwen	• WPL 2 website		\$	09:30 - 12:00		02:30:00
Daily Standup	• WPL 2 website		\$	09:00 - 09:15		00:14:36
Wed, May 10		Total: 05:25:57				
User login - Wachtwoord wijzigen	• WPL 2 website		\$	13:53 - 16:31		02:37:06
2 Product Contracten raadplegen en email verzenden	• WPL 2 website		\$	09:25 - 12:29		02:33:51
Daily Standup	• WPL 2 website		\$	09:00 - 09:15		00:15:00

Daily scrums

Scrum woensdag 10/05/2023

- Emre Ilbay

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Producten toegevoegd en bezig geweest met de product catalogus.

Wat ga je vandaag doen?

Product details pagina maken.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Problemen kunnen altijd optreden. Nee, ik verwacht niet dat de ‘team’ daarbij kan helpen.

- Fatma Turkan Kaya

Gebruiker kan inloggen met e-mail en wachtwoord. de gebruikersnaam en uitloggen-knop verschijnen in de navigatiebalk. De gebruiker wordt naar de homepage geleid en kan zijn gegevens raadplegen.

Vandaag zal ik werken aan het weergeven van de producten die de gebruiker van de site heeft gehuurd in het gedeelte contracten van de profielpagina en deze informatie per e-mail naar de e-mail van de gebruiker sturen. Ik zal ook werken aan het verzenden van een e-mail om het gebruikerswachtwoord te wijzigen.

Scrum donderdag 11/05/2023

- Fatma Turkan Kaya

Ik heb gisteren een javascript geschreven om gebruikerscontractinformatie weer te geven. Ik schreef ook Wep-eindpunt voor het verzenden van e-mail. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het doorgestuurd en verzonken via het eindpunt van de mail.

Vandaag zal ik nieuwe klassen maken om goede architectuur in Backend te creëren. Ik zal de structuur van de ClasLibrary herschikken.

Scrum woensdag 17/05/2023

- Emre Ilbay

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Product details afgewerkt.

Wat ga je vandaag doen?

Beginnen aan de winkelmandje.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Problemen kunnen altijd optreden. Nee, ik verwacht niet dat de ‘team’ daarbij kan helpen.

- Fatma Türkan Kaya

Gisteren ga ik nieuwe klassen maken om een goede architectuur in de backend te creëren. Ik herschikte de ClasLibrarystructuur. Ik herschikte de WebApi-coderingen volgens dit nieuwe systeem.

Vandaag zal ik werken aan hoe de gebruiker zijn informatie kan bijwerken en bekijken. Ik zal ook werken aan mijn individuele taak.

Ik ben na de middag afwezig omdat ik een afspraak heb bij de tandarts.

Scrum woensdag 24/05/2023

- Emre Ilbay

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Winkelmandje grotendeels klaar.

Wat ga je vandaag doen?

Winkelmandje afronden en beginnen aan de orders.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Problemen kunnen altijd optreden. Nee, ik verwacht niet dat de ‘team’ daarbij kan helpen.

- **Fatma Türkan Kaya**

Vandaag was ik afwezig wegens ziekte.

Scrum Donderdag 25/05/2023

- **Emre Ilbay**

Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?

Orders kunnen geplaatst worden.

Wat ga je vandaag doen?

WPF applicatie voor de admins. Producten toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Verwacht je problemen en kan het team daarbij helpen?

Problemen kunnen altijd optreden. Nee, ik verwacht niet dat de 'team' daarbij kan helpen.

- **Fatma Türkan Kaya**

Vandaag was ik afwezig wegens ziekte.

Realisaties (Sprint Review)

Website (front-end)

The screenshot displays two pages of the Depo DenOpschlag website.

Top Navigation: Homepage, Huren, Keuzehulp, Over ons, Contact, Guest (0).

Garage Listing Page:

- Title:** Garagepark in Houthalen-Helchteren
- Image:** A photograph of a modern garage complex with several dark, modular units and open bays.
- Buttons:** Left, Right, and a central zoom icon.
- Description:** Omschrijving: Een vrij eerbaar garageformaat. [Afmetingen: 6m x 3m]
- Options:** Maten: 18m2, 24m2.
- Status:** Volbezet! Beschikbaar vanaf: 25/9/2031
- Costs:** Maandelijkse kosten: €136.73; Eenmalig: €315.25
- Date:** Kies de startdatum voor uw verhuur: 25 / 09 / 2031
- Button:** Huur

Shopping Cart Summary Page:

- Title:** Mijn Winkelwagen:
- Image:** A photograph of a modern industrial building with a yellow sign.
- Address:** Maaseik, 3680
- Size:** Oppervlakte: 18m2
- Costs:** Maandelijks: €130.68; Eenmalig: €315.25; Subtotaal: €445.93
- Quantity:** - 1 +
- Date:** Startdatum: 30 / 05 / 2023
- Duration:** Aantal Maanden: 1
- Buttons:** Verwijderen, Split
- Total:** Totaal: €445.93
- Note:** U moet ingelogd zijn om verder te gaan.

Checkout

Products: 1x

Price: 445.93 EUR

Customer:

Emre Ilbay

PXL

Secure& Fast payment with PXL-pay!

By clicking the button below, you agree to our [Terms and Conditions](#) and [Privacy Policy](#).

Cancel

Confirm

Thank you for your order! You'll be redirected in 5 seconds. 😊



The screenshot shows a user profile page for 'Fatma'. On the left, there's a sidebar with a search bar and a 'Contracten' section listing two contracts: one for Genk (12m²) and one for Hasselt (24m²). On the right, the 'Profiel' section displays the user's name, address, and email, with a 'Gegevens aanpassen' button.


Gemeente	Size	Start Datum
Genk	12m ²	2023-06-02
Hasselt	24m ²	2023-06-02

Profiel

Naam: Kaya
Voornaam: Fatma
E-mailadres: fatma.kaya2@student.pxl.be


Gegevens aanpassen

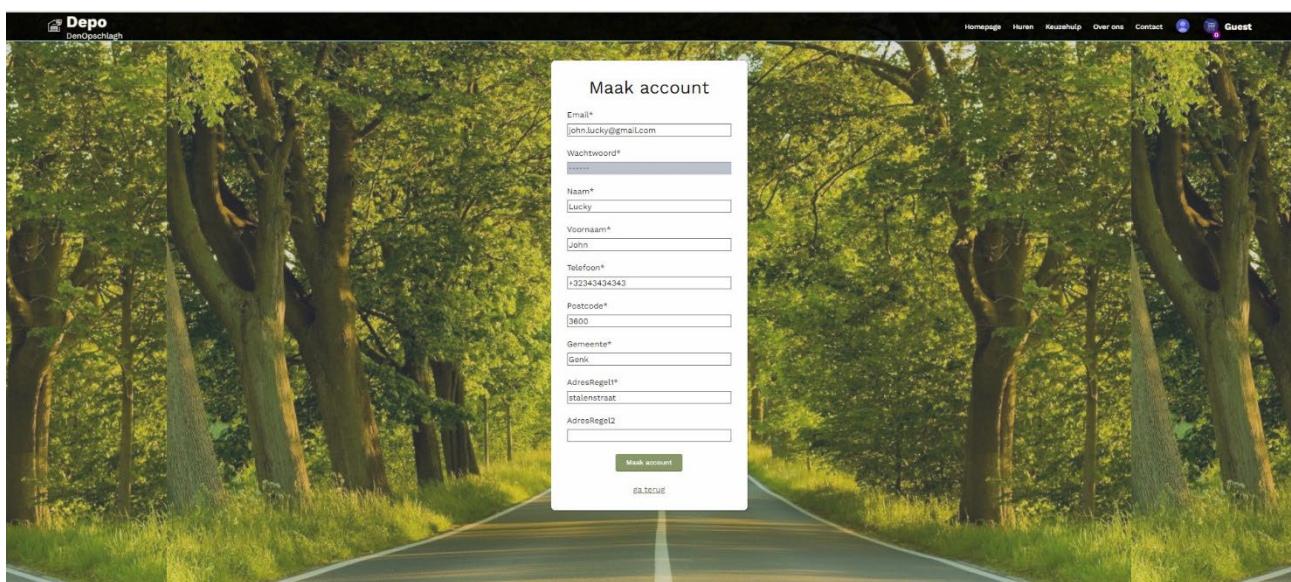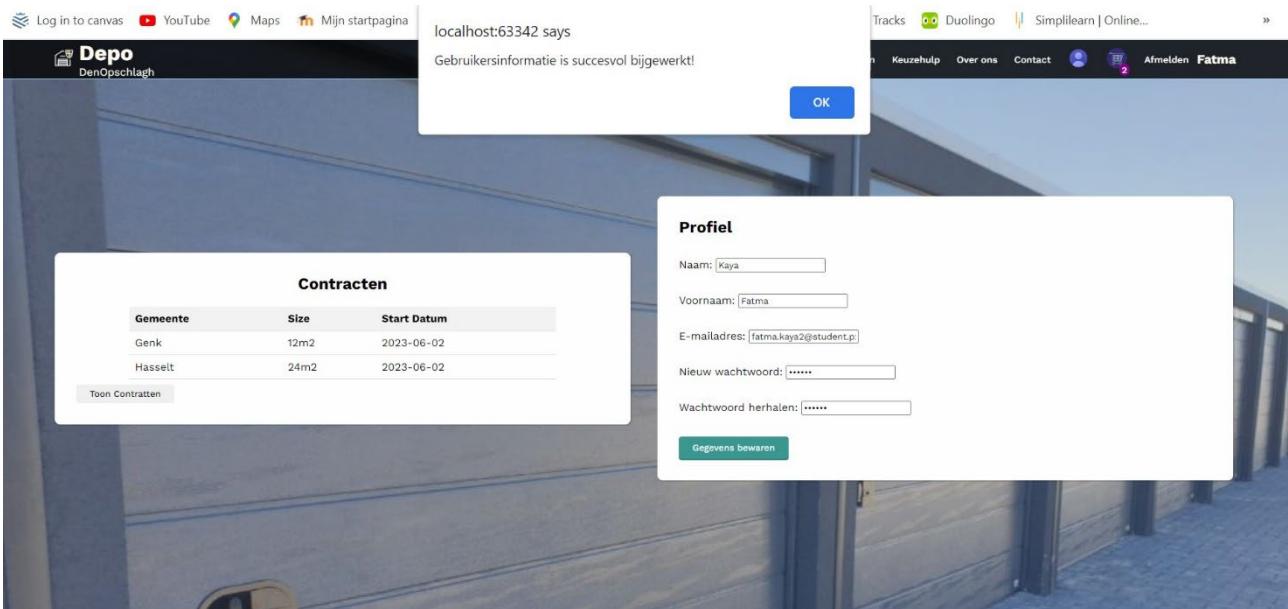

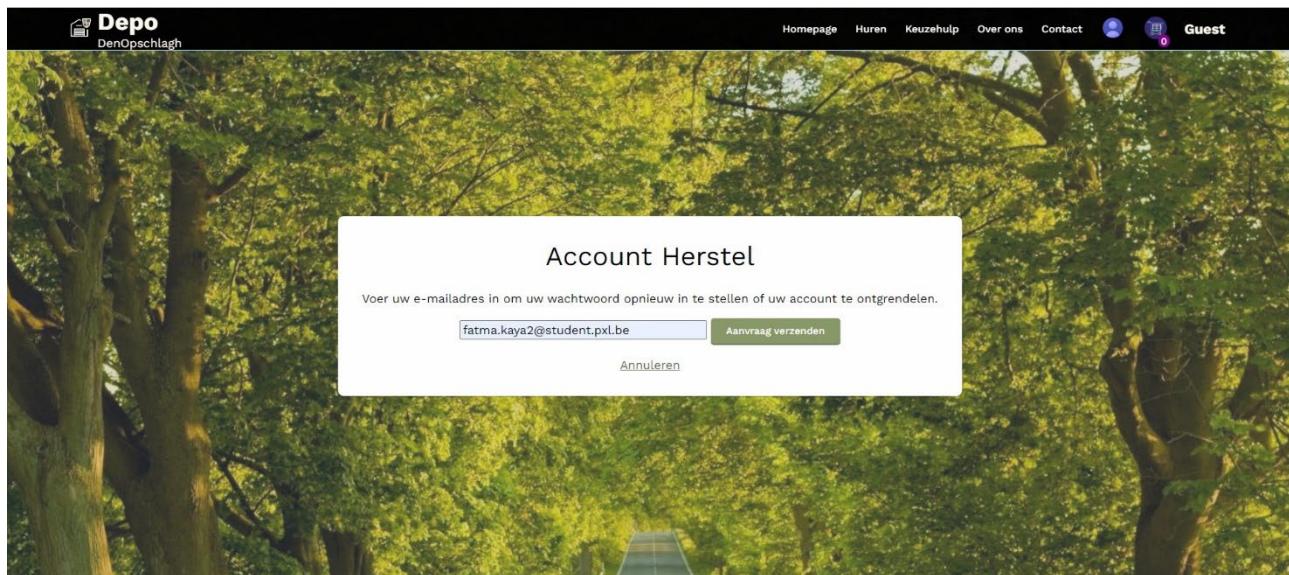

Wireframe

Class Library (optioneel)

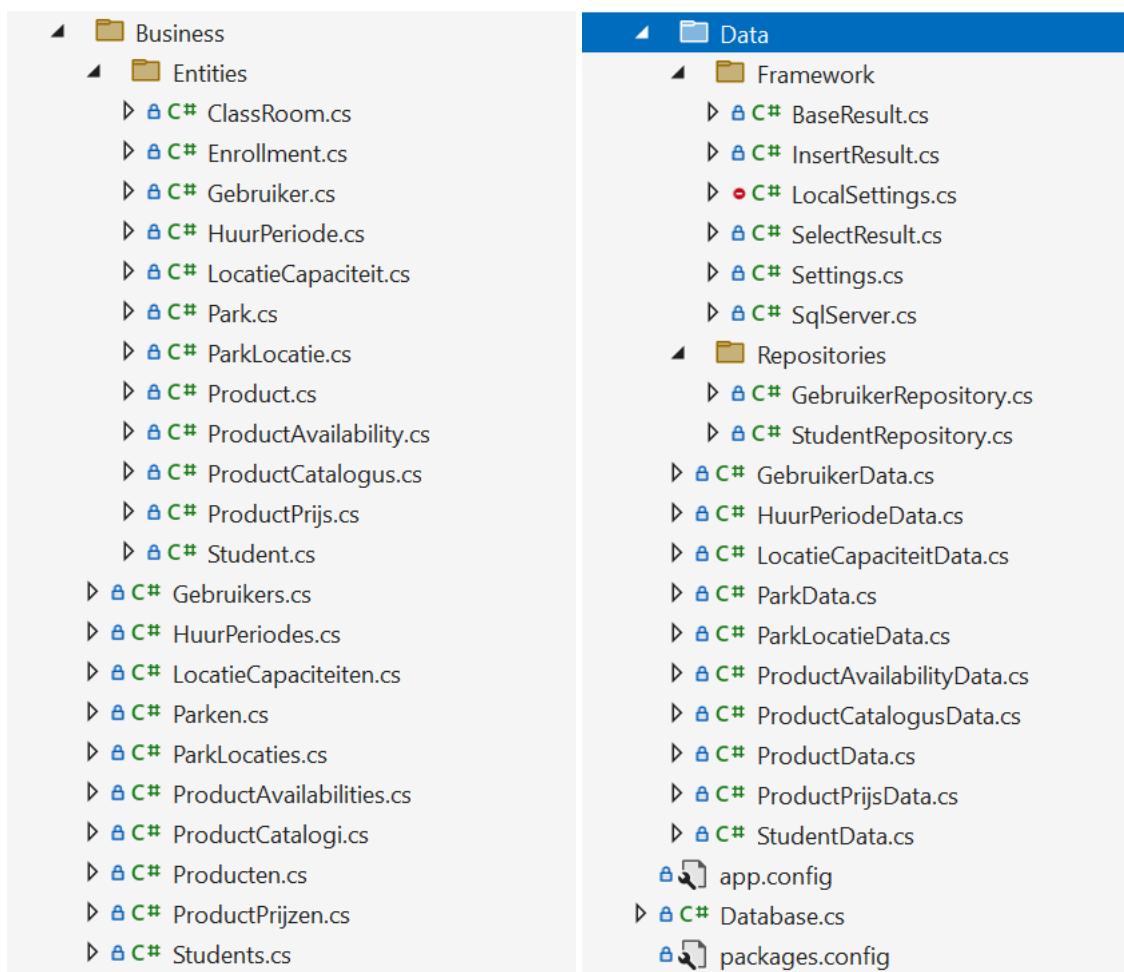

Database

- + dbo.Gebruikers
- + dbo.GpLocatie
- + dbo.HuurPeriode
- + dbo.LocatieCapaciteit
- + dbo.Locaties
- + dbo.PokeTable
- + dbo.Prijzen
- + dbo.Producten
- + dbo.ProductImage

Leerpunten (Sprint Retrospective)

Op het EINDE VAN DE SPRINT bespreek je de leerpunten:

• Wat ging goed?

Ik (Emre) heb de producten afgewerkt. Op een *short notice* heb ik ook nog zitten werken aan de orders/winkelmandje. Die heb ik ook afgekregen. Extra, *because why not*, heb ik nog verder gewerkt aan de app bestemd voor administrators. Producten kunnen toegevoegd worden. Ook kunnen algemeen de tabellen aangepast worden via de app. Programeer kennis is niet nodig voor de admins.

Fatma-- De gebruiker kan inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord, zijn contracten bekijken op zijn profielpagina en ze per e-mail ontvangen. Om het vergeten wachtwoord te wijzigen, kan het nieuwe wachtwoord als e-mail worden verzonden. Hij kan de gebruikersinformatie raadplegen en alle gewenste wijzigingen aanbrengen. Er kan een nieuwe gebruiker worden geregistreerd.

• Wat ging minder goed en waarom?

Ik (weeral Emre) vind dat ik niet echt problemen heb ondervonden.

Mijn grootste probleem was dat ik niks had geschatst. Ik heb hele tijd zitten werken met *trial and error* en ben *back and forth* gegaan. Had geen idee over hoe ik iets zou kunnen implementeren. Ben gewoon aan de slag gegaan en heb veranderingen gebracht en strategieën moeten aanpassen constant. Dit heeft me veel tijd gekost.

Ik (Fatma) had geen idee hoe ik iets moest implementeren. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe ik veel dingen kan doen en ik heb verschillende voorbeeldstudies gedaan om het onderwerp te begrijpen. dit heeft mij veel tijd gekost. maar informatie krijgen over de onderwerpen waaraan ik heb gewerkt, is een winstpunt geweest voor mijn volgende studies.

• Wat wil je verbeteren in volgende sprint?

(Emre) Eerst duidelijk plannen hoe ik iets wil bereiken en dan pas aan de slag gaan.

Aangezien dit ook mijn eerste keer is dat ik zo iets maak, neem ik het mezelf niet te kwalijk.

Fatma-- Ik besefte dat ik, voordat ik aan het project begon, een overzicht moest creëren. dan moet ik mijlpalen instellen die stap voor stap moeten worden gedaan. De werken die ik heb gedaan en moet doen in lijn met deze planning kunnen met een duidelijker zicht naar voren worden gebracht.

Enkele specifieke punten die je ook bespreekt:

• Hoe verliep het technisch werk?

Technische werk liep goed. Kostte wat tijd, maar resultaat werd echter toch bereikt!

Fatma-- Het technische werk was best uitdagend voor mij. Ik heb veel tijd besteed aan het verkrijgen van informatie over gerelateerde onderwerpen.

• Welke opdrachten gingen goed?

Alles (?)

• Over welke realisaties ben je tevreden?

Mijn winkelmandje ziet er mooi uit. De structuur voor producten zijn ook *solid*. Ik vond het *satisfying* om te zien hoe het toevoegen van producten in de database automatisch tevoorschijn kwam op de website.

Fatma-- Om het vergeten wachtwoord te wijzigen, stuurt u het nieuw aangemaakte wachtwoord per e-mail.

- **Welke opdrachten verliepen moeilijk en waarom?**

Werken met datum is echt een warboel. Ik persoonlijk vergeet ook constant welk datum formaat word verwacht. Intellisense vraagt mij om een datum object te casten naar een datum object?? Ik weet het ook niet.

Fatma--Ik heb veel tijd besteed aan het versturen van e-mails. Ik wist niet zeker of dit met de fatch api of de web api moest gebeuren. Ten slotte zag ik dat het uitvoeren van deze bewerkingen met webapi nauwkeuriger is in termen van beveiliging.

- **Welke technische kennis kom je tekort en wat ga je daaraan doen?**

Ik heb veel dingen in Javascript op een minder efficiënt manier geprogrammeerd. Was blij dat het werkte, maar was niet zo tevreden over de manier hoe ik het heb geschreven. Door nieuwe dingen te leren ga je automatisch betere manieren vinden om een doel te bereiken. Ik persoonlijk ben recent begonnen aan LeetCode. Kies een issue daar en probeer het op te lossen. Vervolgens controleer ik mijn code via de al gesubmitte solutions. Vind het heel interessant om te zien hoe andere mensen een oplossing bedenken.

Fatma-- Ik had geen idee van javascript, web api en fetch api. Hiervoor heb ik tijd doorgebracht op een enkel onderwijsplatform, ik kan informatie over deze kwesties krijgen.

- **Zou je het anders of efficiënter aan kunnen pakken? Zo ja, hoe?**

Yes please, maar hoe? Laten we de filosofische vragen buiten laten, want dat laat mij mijn existentie betwijfelen :)

- **Zeer belangrijk: welk zijn hieruit je actiepunten voor volgende sprint**

Dit was de laatste sprint. Voor de volgende project hoop ik in een betere team te belanden. Mijn focus zal veel liggen in plannen!

Hoe verliepen daily stand ups?

- **Wat ging er goed in de samenkomst?**

Stand-ups hadden hun waarde verloren. Omdat er geen samenhang meer was, maakte het ook niet meer uit wie wat deed. De scrumbord had ook geen effect niet meer.

- **Wat ging er moeilijk?**

Niks. Letterlijk niks. Vertel kort wat je deed en wat je gaat doen. Niemand had commentaar op wat iemand zei.

- **Wat willen jullie behouden en wat anders doen?**

Het is moeilijk om op team gebaseerde vragen een antwoord te formuleren. We hebben een hele semester lang geen fatsoenlijk team gehad. En nu zitten we maar met twee, wat word er nog van ons verwacht? Team etiquette werd uitgevoerd voor formaliteit redenen, niet dat ze enig meerwaarde voegden aan het project of team dynamiek.

Hoe verliep het invullen van de rol van scrum master? (enkel in te vullen door de scrum master)

- **Wie was scrum master?**

Er was geen scrum master.

- **Hoe heb je dit ervaren? Wat ging goed? Wat ging minder goed?**

- Hoe hebben de anderen jou ervaren als scrum master? (vraag feedback)
- Ligt dit jou of minder? Geef uitleg bij je mening.
- Welke tip geef je mee aan de volgende scrum master?

Hoe verliep de samenwerking in je groep?

- Is jullie groep al een team?
 - Waarom wel/waarom niet?
 - Wat is er nog nodig volgens jou?
- Hoe verliep de communicatie onderling?
- Hebben jullie mekaar geholpen of heb je hulp ondervonden? Welke hulp is er gegeven?

Feedback

Team

Na ons eindpresentatie werden we bedankt en weg gestuurd. We hebben letterlijk 0 feedback ontvangen.

Individueel

HET EINDRESULTAAT

Functionaliteiten

2.1. Homepagina

Op de homepagina word er duidelijk gemaakt wat ons website doet. Ook zijn er snelle links om tijdens het lezen van een alinea te springen naar de corresponde website. Bijvoorbeeld: je leest iets over de opslagruimtes, er staat een knop dat je redirect naar de pagina waar er meer details over word gegeven. De pagina heeft een vrij simpel en to the point opmaak.

2.2. Aanloggen op de website

Wanneer u zich als gebruiker op de site aanmeldt, wordt de gebruiker omgeleid naar de startpagina, omdat de inlogpagina niet meer moet worden weergegeven omdat dit de inlogpagina is. Bovendien wordt de profielpagina omgeleid in plaats van de inlogpagina. Alleen gebruikers hebben dus toegang tot de profielpagina.

2.3. Profiel Pagina-Contract gegevens

Op de profielpagina is er een gedeelte waar de contractinformatie wordt getoond, waar de gebruiker een overzicht kan vinden van de aankopen die hij heeft gedaan en deze als e-mail kan ontvangen.

2.4. Uitloggen

Wanneer de gebruiker uitlogt, worden de items in zijn winkelwagen gereset. De weergave van de producten in de winkelmandje gaat dus niet door in gevallen waarin er geen invoer is gemaakt.

2.5. Inlogpagina- wachtwoord vergeten

Wanneer de gebruiker zijn wachtwoord vergeet, met de knop wachtwoord vergeten, als het door de persoon ingevoerde e-mailadres compatibel is met het geregistreerde e-mailadres, zal het nieuw aan te maken wachtwoord naar het ingevoerde e-mailadres worden verzonden. Zo kan de persoon met dit wachtwoord inloggen op de site en zijn nieuwe wachtwoord opnieuw bepalen met de profielpagina.

2.6. Productinformatie en producten kiezen

Er is een product catalogus voorzien op de huren pagina. Hier worden alle garageparken geladen met de prijzen en beschikbare afmetingen. Vervolgens kan de gebruiker op een locatie kiezen om een meer gedetailleerde overzicht te krijgen. Hier kan de gebruiker het product aan zijn/haar winkelmandje toevoegen.

2.7. Een bestelling/reservatie plaatsen

Alle gekozen artikelen bevinden zich in de winkelmandje. Hier kan er nog wijzigingen gebracht worden. Eenmaal tevreden kan er besteld worden. Tijdens het plaatsen van de order word de gebruiker doorverwezen naar de checkout pagina. Hier worden de volgende zaken getoond:

- Aantal producten
- Totaal prijs
- De klant
- De betaalmethode (PXL-Pay in ons geval)
- Privacy verklaringen & terms and services

Word de aankoop bevestigd door de gebruiker dan verstuurde de website een verzoek voor een nieuw entry in de HuurPeriode tabel. In deze tabel worden alle huurcontracten bewaard.

2.8. Mogelijkheden voor een gebruiker van het bedrijf

Er is een WPF applicatie voorzien voor al onze administrators. Via hier kunnen tabellen geraadpleegd worden. Ook is er de mogelijkheid om tabellen aan te passen of rijen te verwijderen. Extra, kunnen de admins via de app nieuwe garageparken toevoegen, zonder over enige kennis te beschikken over programmeren.

Huisstijl

Algemeen hanteert de website een grijs, donker of blauw achtergrond.

Op de voorgrond worden er meestal blauwe of groene knoppen gebruikt. Textkleuren verschillen naargelang de achtergrond.

Soms maken we gebruik van afbeeldingen in de achtergrond. Dit zorgt voor variatie en is algemeen *aesthetically pleasing* voor de ogen.

Op onze website krijg je echt het gevoel dat je in een container zit :)

Foutmeldingen

Op pagina's waar er een fetch word gepleegd voor producten/orders, is er een 'LoadingIndicator' en 'ErrorMessage' voorzien. Hier kan ik de gebruiker laten weten dat er een fetch gaande is. Tegelijkertijd kan ik een foutmelding weergeven in een mooiere formaat.

Testen

Testen begint eerst met het kijken naar of je code werkt. Nadat je een gedeelte af hebt gewerkt, maak je gebruik van je dienst op een nette manier. Blijkt het dat alles goed werkt, dan stappen we over naar de *unga bunga* test methode, ook wel gekend als de monkey test. Hier proberen we explicet gaten te vinden in ons systeem en proberen we ook de werkingen te breken.

Oplevering Product Backlog

Werkplekleren 2 - Programmeren				
Product Backlog			Planning	Realisatie
Nr	Topic	User story	Sprint nr	
1	User Login	Als gebruiker wil hij/zij kunnen inloggen op de website, zodat hij/zij vanaf de site kan winkelen.	3	3
2	User Login	Als gebruiker wil hij/zij de gebruikersgegevens raadplegen, zodat hij/zij kan zien of er fouten in zijn/haar gegevens staan.	3	3
3	User Login	Als gebruiker wil hij/zij wijzigingen kunnen aanbrengen in de gebruikersgegevens, zodat hij/zij zijn/haar onjuist opgeslagen of later gewijzigde gegevens kan bijwerken.	3	4
4	User Login	Wanneer een gebruiker zich als gebruiker afmeldt, wil hij/zij niet dat de profielpagina wordt weergegeven, zodat hij/zij weet dat zijn profielgegevens niet door anderen worden gezien.	3	3
5	User Login	Als gebruiker wil hij/zij dat op de profielpagina de lijst met aankopen die hij/zij op de site heeft gedaan wordt weergegeven en hij/zij wil deze als e-mail kunnen ontvangen, zodat hij/zij een overzicht van de producten heeft.	4	4

6	User Login	Als bezoeker wil hij/zij lid zijn van de site, zodat hij/zij vanaf de site kan winkelen.	3	4
7	User Login	Als gebruiker wil hij/zij zijn/haar vergeten wachtwoord vernieuwen, zodat hij/zij met het opgegeven wachtwoord kan inloggen op de site en kan winkelen.	4	4
8	User Logen	Als gebruiker wil hij/zij bij het uitloggen de producten in het winkelmandje resetten, zodat de weergave van de producten in het winkelmandje niet doorgaat als er niet ingelogd wordt.	4	4
9	Producten	Gebruikers kunnen producten raadplegen	3	3
10	Producten	Gebruikers kunnen product details zien	3	3
11	Producten/orders	Gebruikers kunnen producten huren	3	4
12	Producten/orders	Er is een winkelmandje voorzien	4	4
13	Producten	Admins kunnen tabellen aanpassen en garages toevoegen	4	4

EINDREFLECTIE

Werkverdeling in het team

Fatma heeft gewerkt aan de gebruikers gerelateerde issues en Emre heeft zitten werken aan de producten en orders.

Teamsamenwerking

Iedereen heeft voornamelijk voor zich gewerkt dus er viel niet veel in de mouwtjes qua samenwerking. We hielden nog steeds stands om te zien hoe de zaken verliepen. Echter was geen samenhang.

Technische realisatie, uitdagingen en problemen

Een website waar een gebruiker producten kan raadplegen en een order kan plaatsen.

Ter extra is er een applicatie voorzien voor de admins om tabellen in de database aan te passen.

De gebruiker kan toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, wijzigingen aanbrengen en een e-mail ontvangen om zijn vergeten wachtwoord te vernieuwen.

Persoonlijke reflectie

Emre:

Ik hoop dat ik dit nooit meer mee maak. Ik ben miserabel geworden deze semester. Het omgaan met mensen die geen moeite stopten, technisch zwak waren en met alle moeite dat probeerden te verbergen. Er werd niet eerlijk gecommuniceerd. Ik heb niemand iets kunnen toe vertrouwen. Achteraf heeft 1 teamlid nog verantwoordelijkheden genomen. Triestig.

Ik heb veel geleerd over hoe dingen verlopen. Hoe de fetch's werken, hoe de API's werken, enz. Ik heb me ook gerealiseerd dat er constant met objecten en arrays/lijsten wordt gewerkt.

Fatma:

Ik heb veel onderwerpen ontdekt die ik eerder niet had ervaren en nieuwe benaderingen geprobeerd om onze toepassingen te verbeteren. Deze ervaringen hebben me geholpen om mijn technische kennis te verdiepen en mijn praktische vaardigheden te ontwikkelen.

Voor het volgende project hoop ik te kunnen werken met een team waar teamleden meer kennis hebben van elkaar's competenties en sterke punten en professioneler zijn in termen van zowel soft skills als technische kennis. Ik vind dat kwalificaties elkaar moeten aanvullen. Ik denk niet dat iemand in deze zin superieur is aan iemand. Door de uitdagingen van het project aan te gaan, heb ik mijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen vergroot. We werkten samen met mensen uit verschillende disciplines en kregen de mogelijkheid om elkaar sterke punten te ontdekken en ons te richten op gemeenschappelijke doelen. Ik slaagde er beter in mijn ideeën effectief te uiten en de ideeën van anderen te begrijpen.
